

令和5年9月市議会 建設水道委員会資料

所管事項調査に関する資料

目次	ページ
1 令和5年度主要事業の執行予定について	2～ 8


中央総合事務所
東総合事務所
北総合事務所
令和5年9月

1 令和5年度主要事業の執行予定について

■以下の表は現時点における主要事業の執行予定です。今後の執行予定額については、追加の補助に伴い変更となることもあります。

令和5年8月時点（単位：千円）

区分	番号	事業実施箇所	予算額 (A)	執行 予定額 (B)	差引額 (B)-(A)	予算の内容 → 執行予定内容 ※は補足説明	全体計画及び進捗率				
							事業期間	事業計画	総事業費	進捗率	
										R4 (R5.3月末)	R5見込み (R6.3月末)
道路	1	西山目覚町線	40,000	34,000	▲6,000	工事 L= 400m → 工事 L=340 m ※内示減による 工事内容の見直し	R3年度～R7年度	延長 L=2,700m	223,000	37%	50%
	2	魚の町賑町1号線	29,000	29,000	0	工事 L= 160 m → 変更なし	R5年度～R6年度	延長 L=300m	55,000	—	53%
	3	通学路緊急対策	131,100	130,804	▲296	9箇所対策工事 → 変更なし	R3年度～R8年度	対策箇所 92箇所 (対策数 154)	583,800	14%	42%
斜面	4	立山地区	84,500	84,500	0	工事 L= 50 m → 変更なし	H15年度～R6年度	延長 L=715m	2,050,000	71%	75%
唐人	5	唐人屋敷地区	80,000	80,000	0	埋蔵文化財整理作業 公園整備など → 変更なし → 変更なし	H17年度～R6年度	地域拠点施設の整備、唐人屋敷象徴門の建設など	1,160,215	63%	70%
公園	6	公園施設長寿命化	78,200	42,000	▲36,200	11公園整備工事 → 8公園整備工事 ※内示減による 工事内容の見直し	—	—	—	—	—

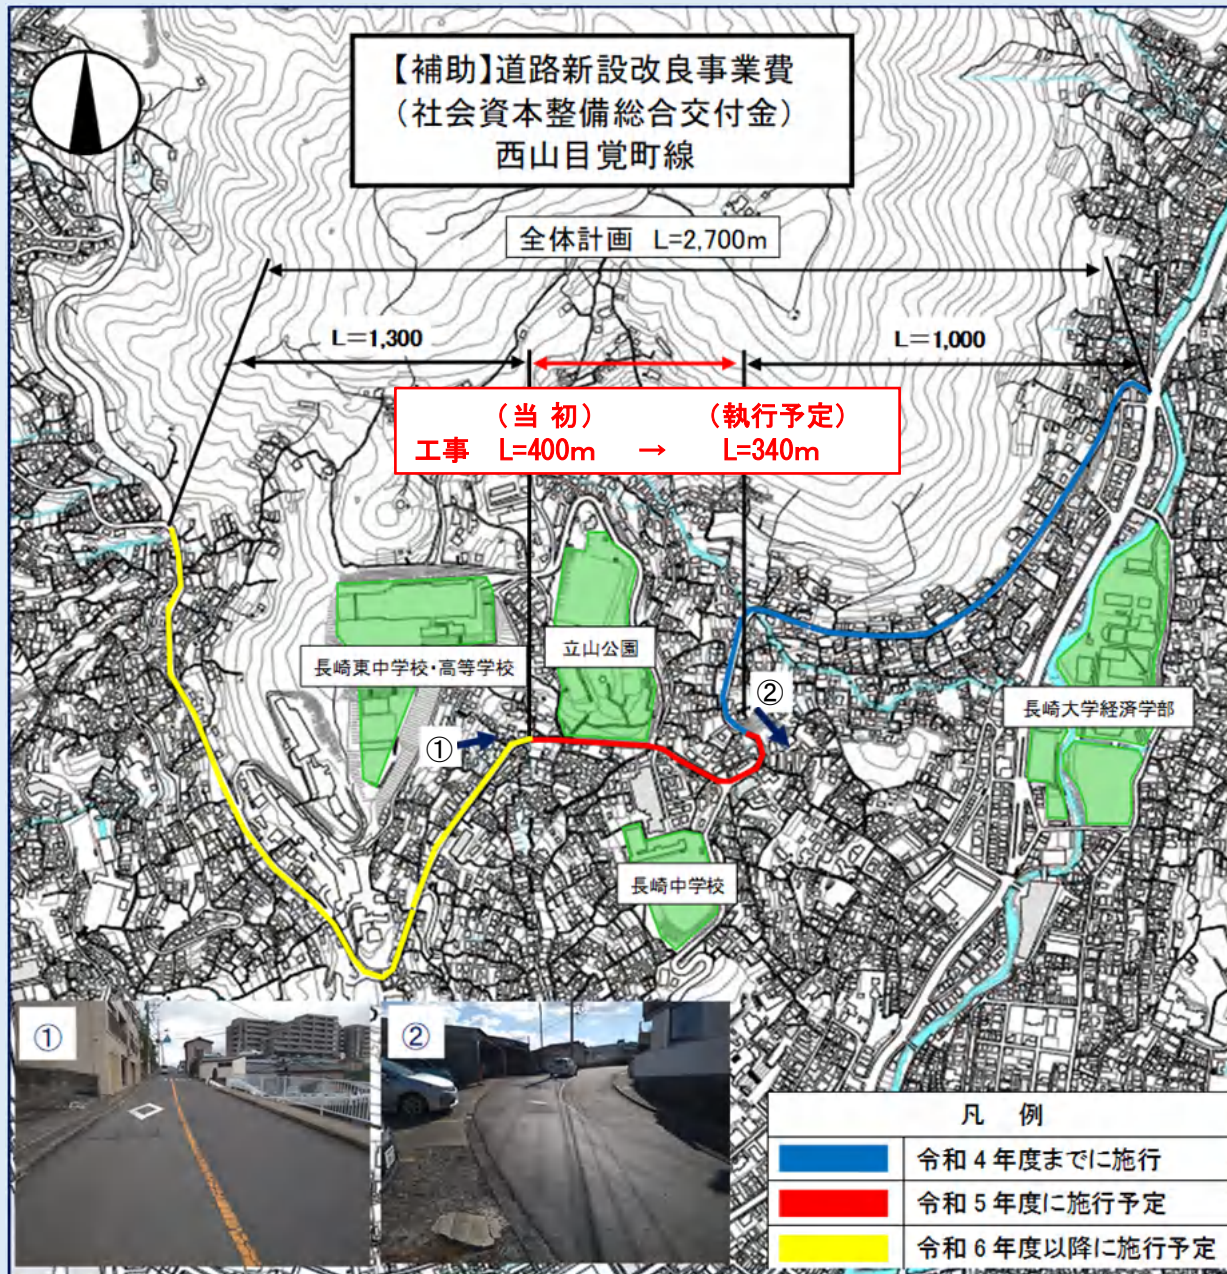


【補助】都市構造再編事業費 まちなか地区



(当初) 工事 L=160m → (執行予定) 変更なし

凡 例	
	令和5年度に施行予定
	令和6年度以降に施行予定

【補助】交通安全施設整備事業費
通学路緊急安全対策
位置図

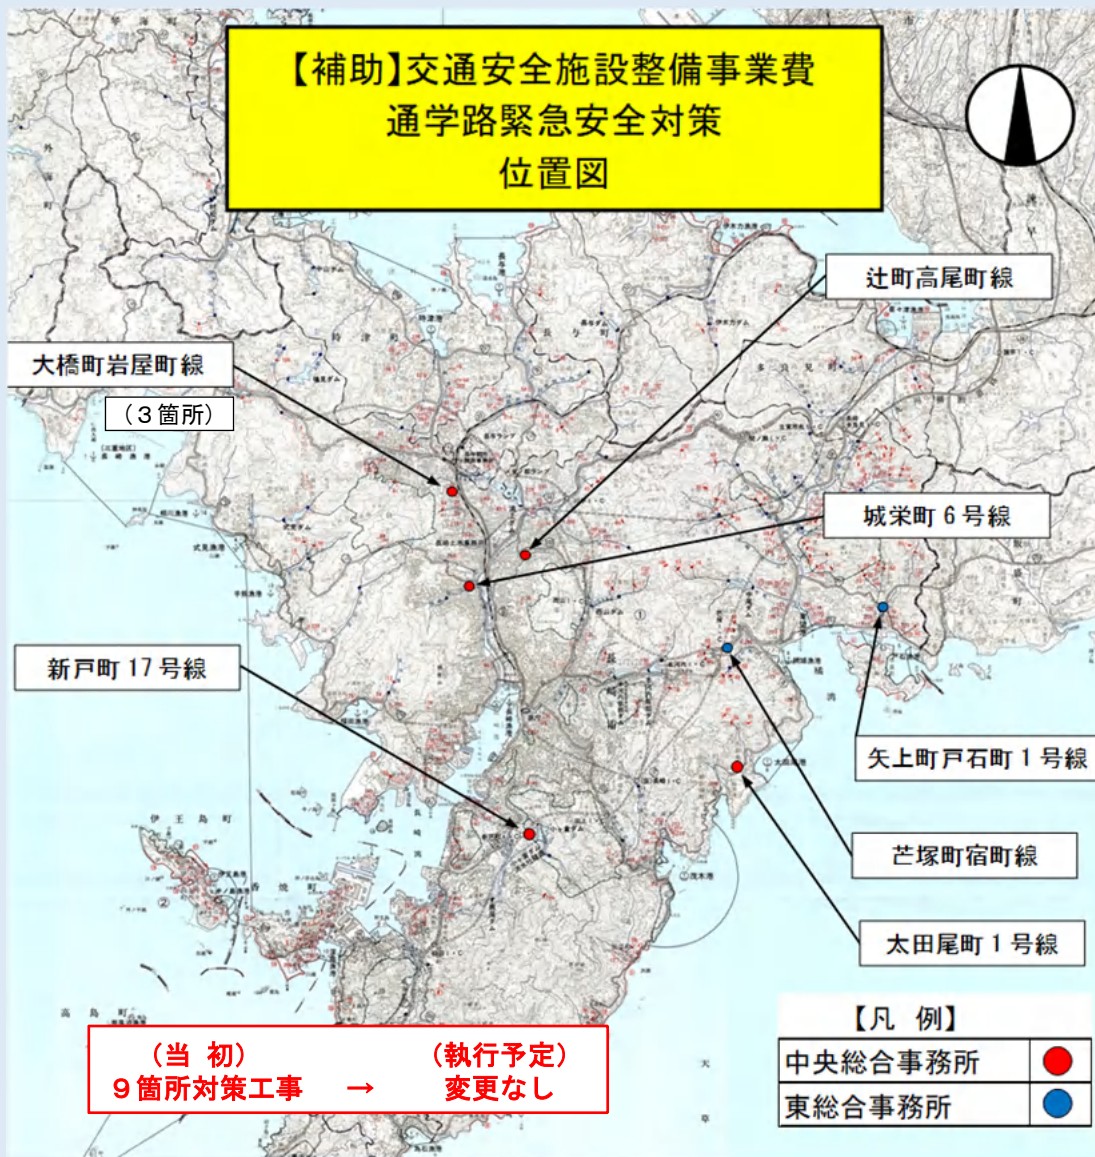


(当初) 9箇所対策工事 → (執行予定) 変更なし

【凡例】

中央総合事務所	●
東総合事務所	●

対策内容	事業内容	区分	対象小学校	路線名
歩道整備	工事	中央	高尾小	辻町高尾町線
			城山小	城栄町6号線
		東	戸石小	矢上町戸石町1号線
交差点改良	工事	中央	西北小	大橋町岩屋町線
防護柵設置	工事	中央	戸町小	新戸町17号線
鉄製ポール設置	工事	中央	西北小	大橋町岩屋町線
			日吉小	太田尾町1号線
グリーンベルト新設	工事	東	日見小	芒塚町宿町線

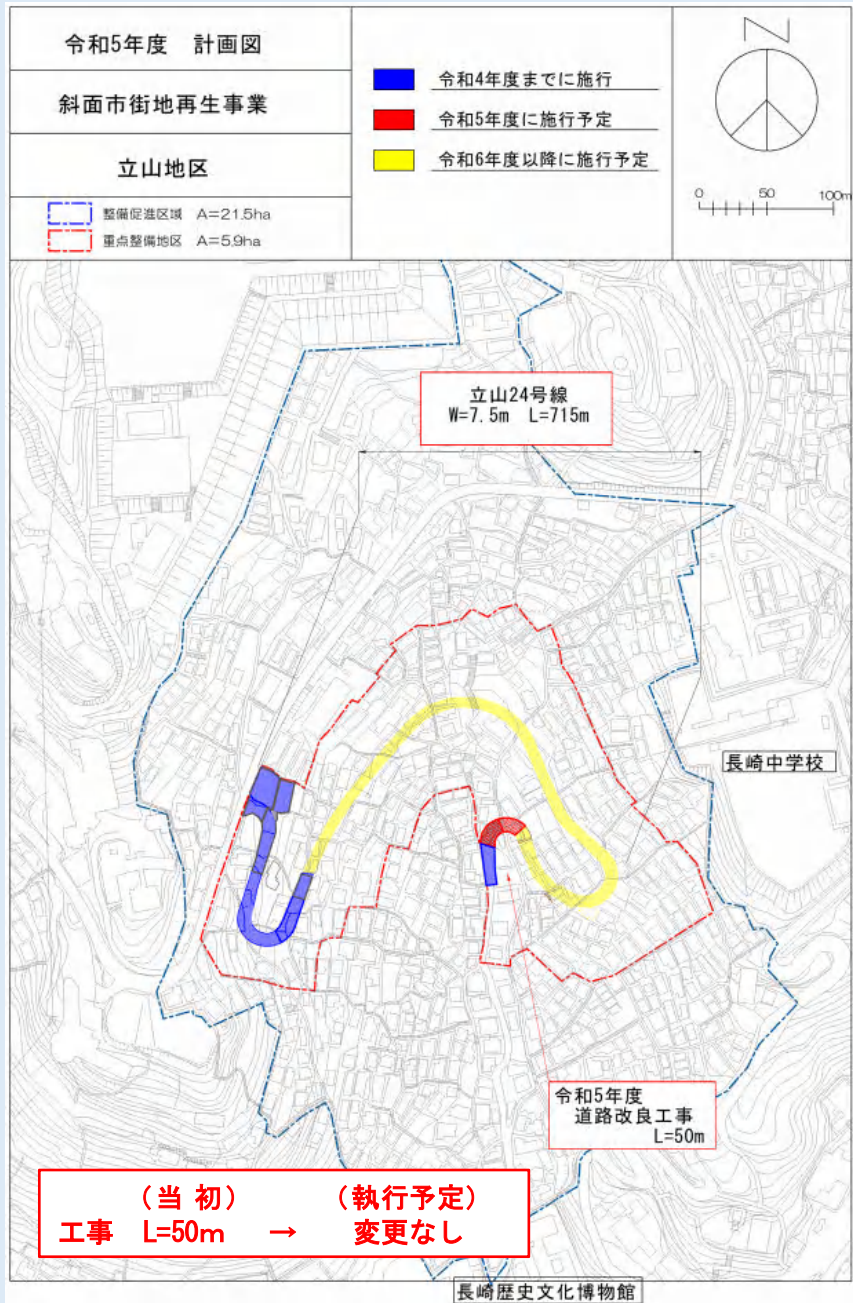


唐人屋敷顕在化事業

唐人屋敷跡
A=3.6ha

街なみ環境整備事業促進地区
A=5.5ha

令和4年度までに施行

令和5年度に施行予定



(当初) (執行予定)
埋蔵文化財整理作業 → 変更なし
公園整備など → 変更なし





~~1 女の都運動公園(複合遊具ほか)~~



2 立神公園(複合遊具ほか)



3 鮎の浦公園
(ブランコ(4連)ほか)



4 水の浦公園(複合遊具ほか)



~~5 花園公園(複合遊具)~~



6 みなと坂船の公園
(スカイロープほか)



7 白岩(しらいわ)公園
(スベリ台(二流)ほか)



8 戸町2丁目公園
(スベリ台(一流)ほか)



9 みなと坂やしのき公園
(ブランコ(2連))



10 天神籠公園(複合遊具)



~~11 琴海南部公園(複合遊具)~~
