

令和2年11月市議会 環境経済委員会資料

第196号議案 工事の請負契約の一部変更について  
林道大崎線地すべり災害復旧工事

目次


1	工事の請負契約の一部変更について	1ページ
2	概要	2ページ

南総合事務所  
理財部

令和2年11月

1 工事の請負契約の一部変更について

第196号議案資料		担当	南総合事務所 理財部
工 事 名		林道大崎線地すべり災害復旧工事	
工 期	変更前	議会の議決を得た日から令和3年3月15日まで	
	変更後	議会の議決を得た日から令和3年3月25日まで	
契約変更の理由		令和2年9月豪雨により被災した工事現場に向かう道路及び同現場の作業ヤードの復旧に日数を要したことに伴い、工期を変更するもの。	
契 約 金 額		260,665,045円	
相 手 方		長崎市宝町4番30号 株式会社星野組 代表取締役 星野 憲司	
工 事 概 要		<p>1 工事場所 鹿尾町</p> <p>2 工事内容 延 長 96.6メートル</p> <p>土工 一式</p> <p>法面保護工 2,976.7平方メートル</p> <p>アンカー工 109本</p> <p>舗装工 382.5平方メートル</p> <p>排水施設工 77.8メートル</p> <p>擁壁工 33.0メートル</p> <p>防護柵工 35.0メートル</p> <p>撤去工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>	

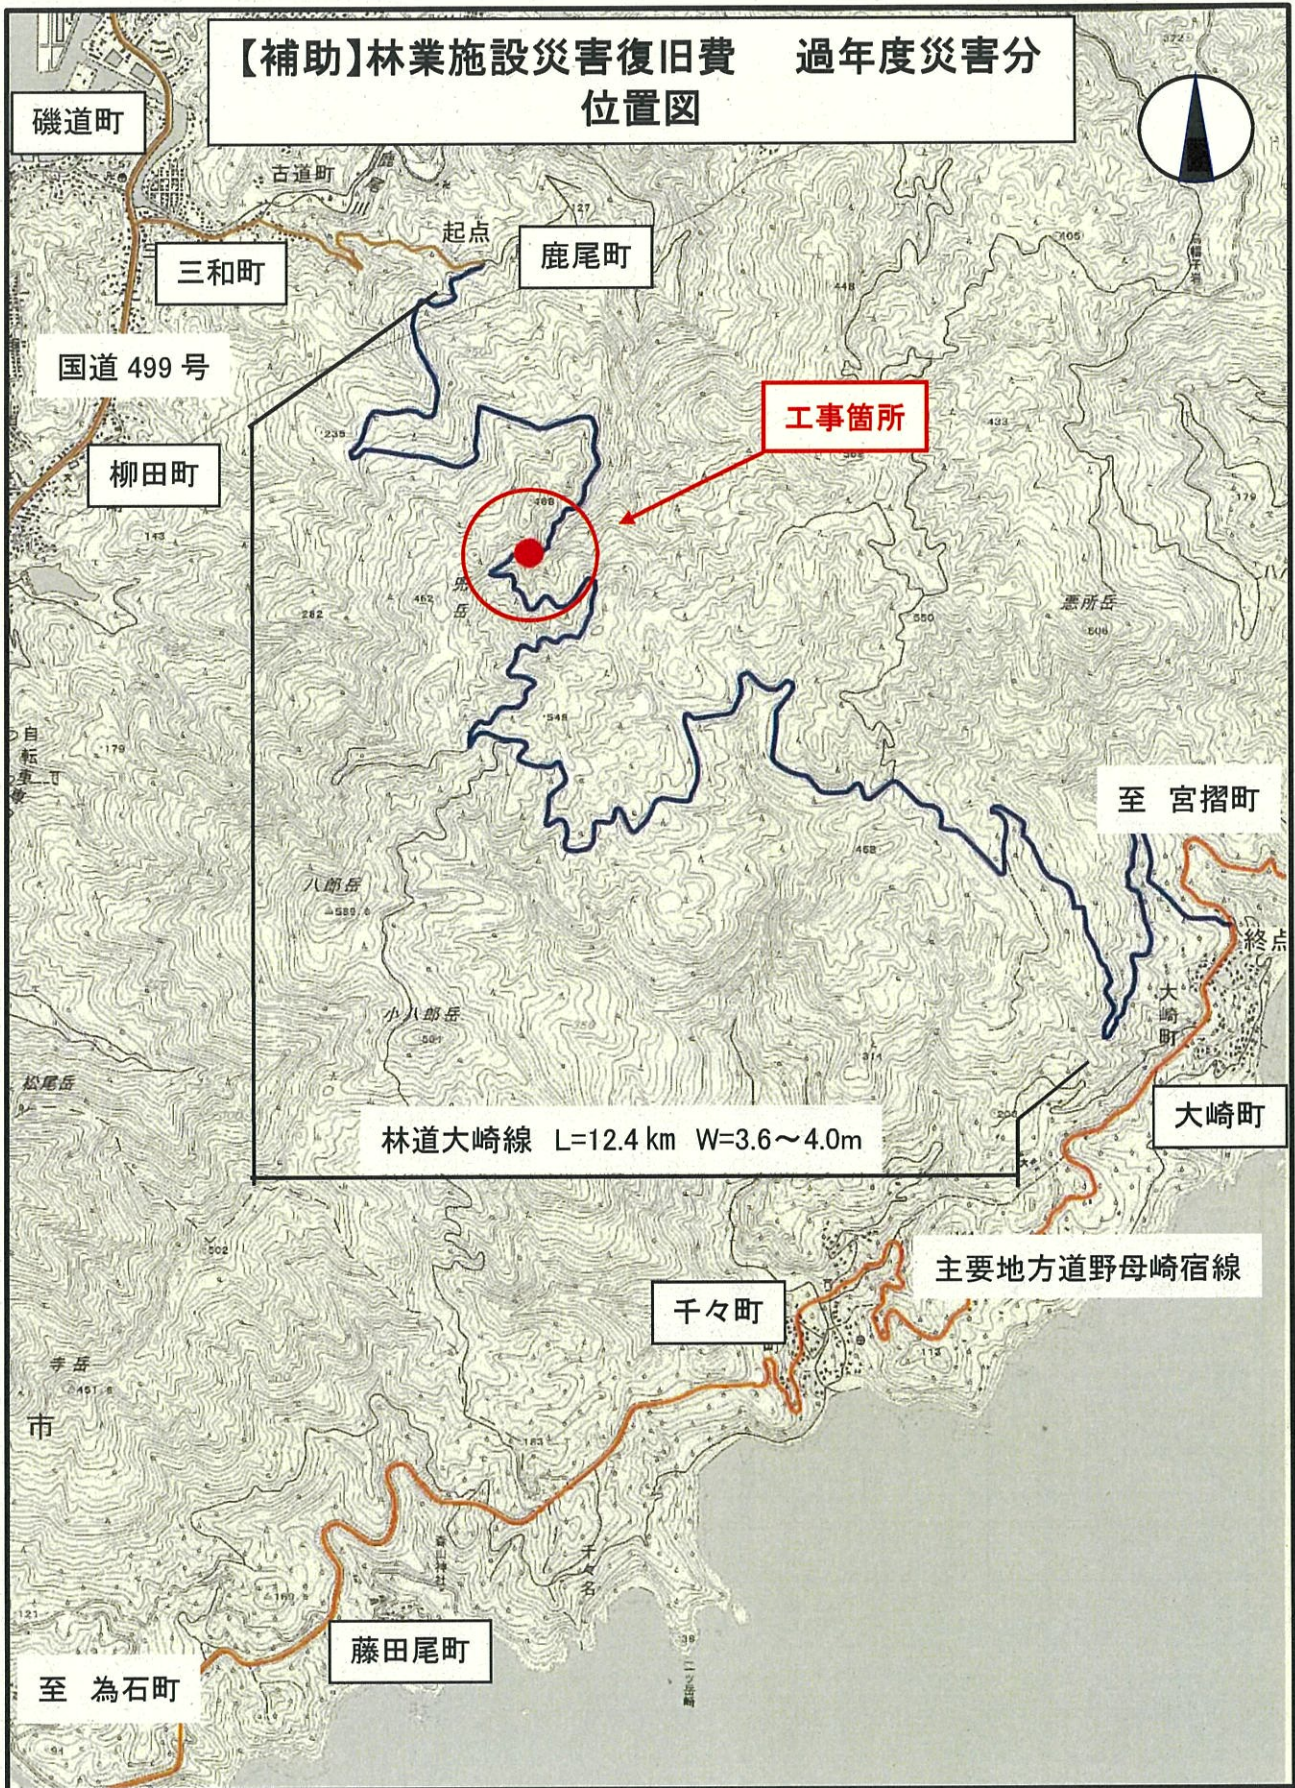


# 林道大崎線地すべり災害復旧工事

## 平面図



工事延長 L=96.6m  
 土工 一式、法面保護工 A=2976.7m<sup>2</sup>、アンカー工 N=109本、  
 舗装工 A=382.5m<sup>2</sup>、排水施設工 L=77.8m、擁壁工 L=33m、  
 防護柵工 L=35m、撤去工 一式、仮設工 一式

至 三和町

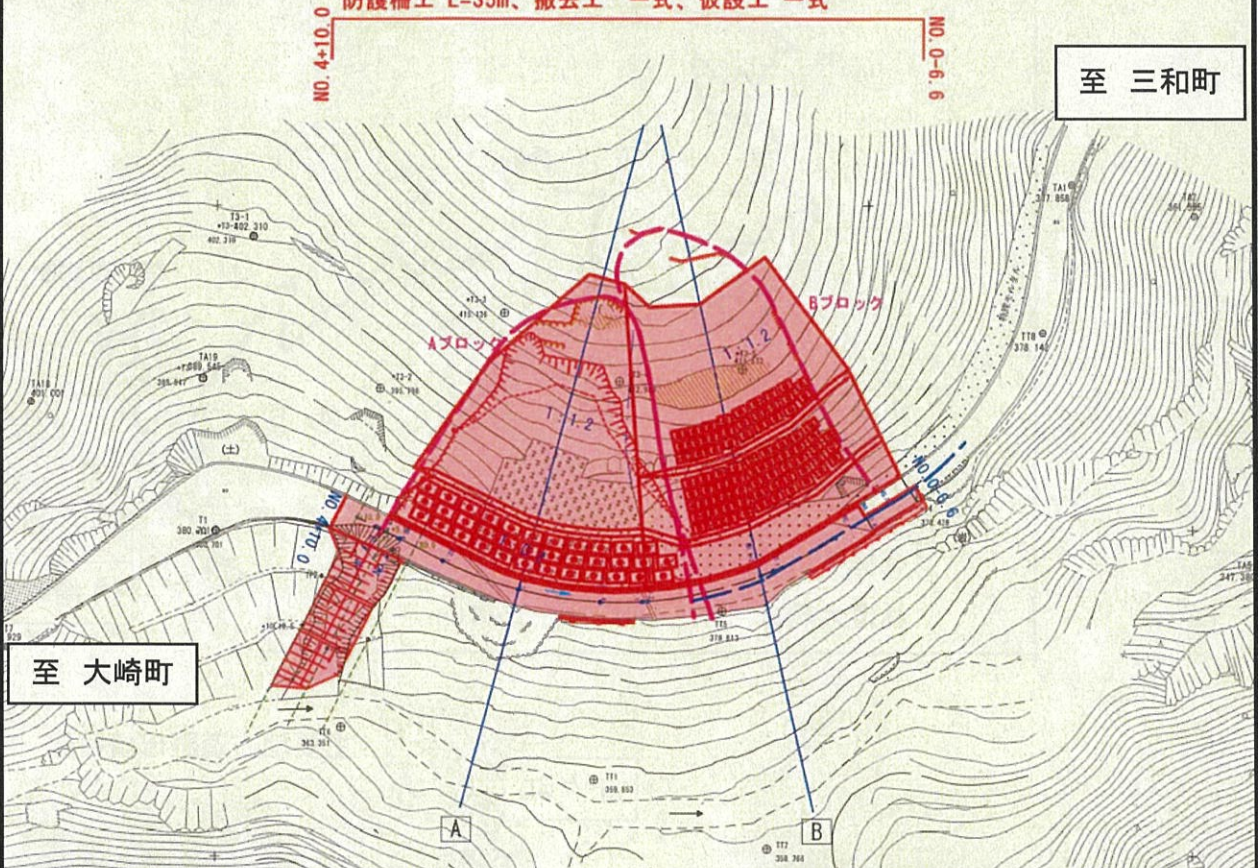

至 大崎町



終点側



起点側

【補助】林業施設災害復旧費 過年度災害分  
被災状況位置図



① 主要地方道野母崎宿線  
9月12日被災・9月13日復旧



② 林道大崎線  
9月12日被災・9月19日復旧



③ 林道大崎線  
9月12日被災・9月19日復旧



④ 林道大崎線  
9月12日被災・9月19日復旧



⑤ 林道大崎線  
9月12日被災・9月19日復旧




⑥ 施工現場  
9月12日被災・9月22日復旧





林道大崎線地すべり災害復旧工事スケジュール

当初	■
変更	■
実施	■

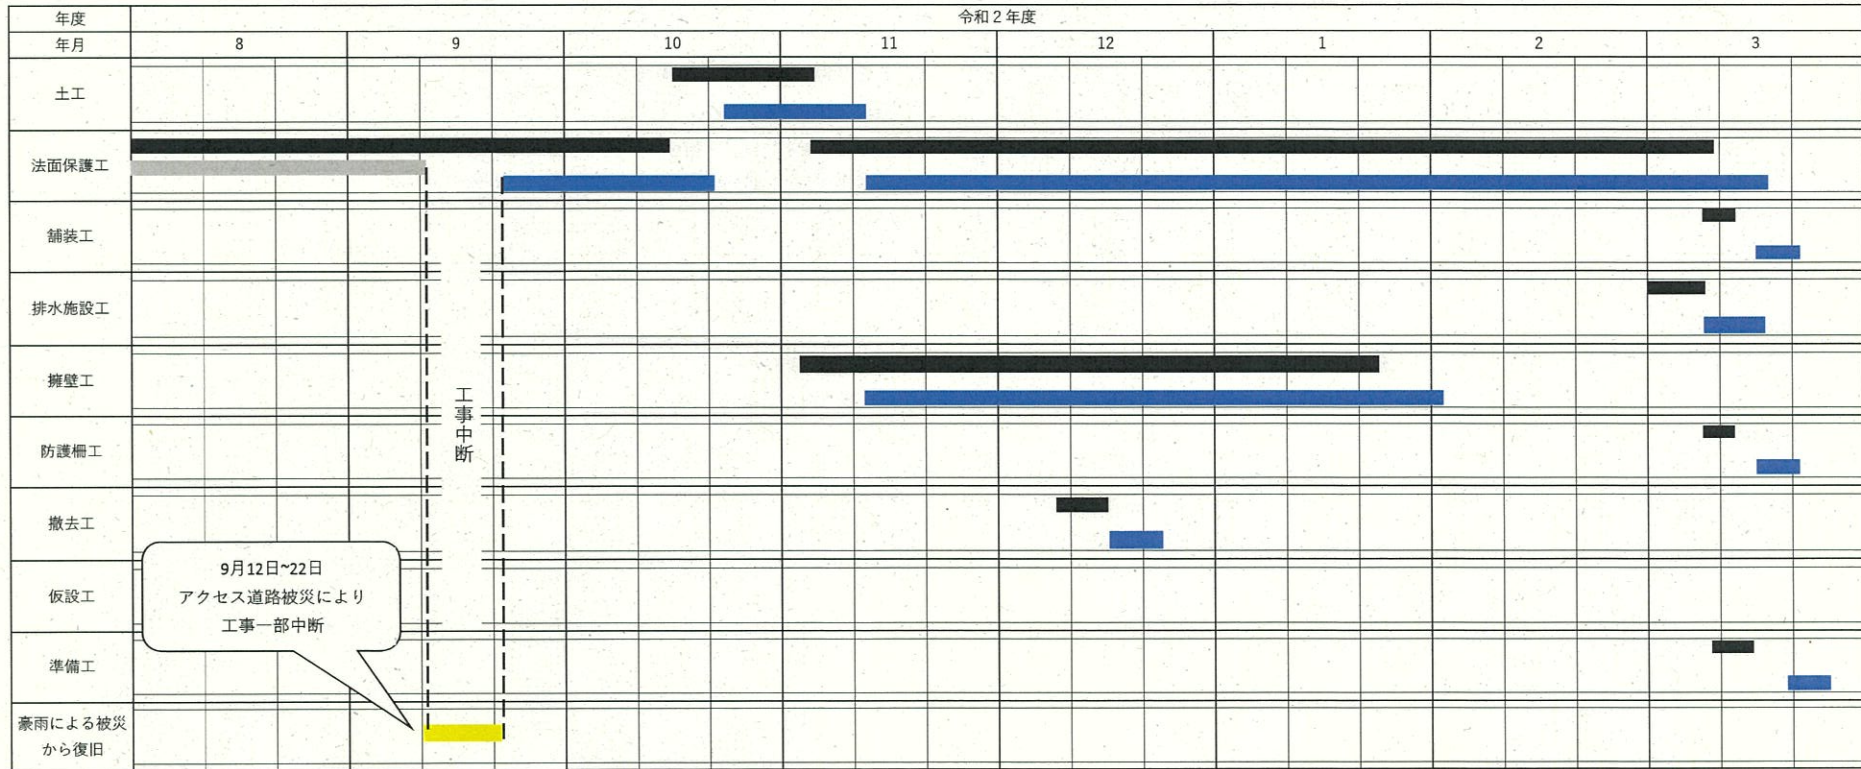

# 現況写真

