


令和4年2月市議会 建設水道委員会資料

第12号議案 令和3年度長崎市一般会計補正予算（第24号）

目次	ページ
[8款 土木費 4項 港湾費]	
2目 県施行事業費負担金	
繰越明許費補正	1~14
[8款 土木費 5項 都市計画費]	
1目 都市計画総務費	
繰越明許費補正	15~18
2目 都市開発費	
繰越明許費補正	19~23
7目 県施行事業費負担金	
繰越明許費補正	24~25

まちづくり部
令和4年2月



【繰越明許費】予算説明書 54～55 ページ

8 款 土木費 4 項 港湾費 2 目 県施行事業費負担金

(単位:千円)

事業名	金額		財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
港湾費負担金 港湾事業費	予算現額	590,306	-	-	537,900	-	52,406
	支出予定額	338,867	-	-	310,000	-	28,867
	繰越明許額 (1月補正)	101,520	-	-	101,500	-	20
	繰越明許額 (2月補正)	149,919	-	-	126,400	-	23,519
	繰越明許額 合計	251,439	-	-	227,900	-	23,539
繰越事由	別紙のとおり						
繰越箇所の 完了予定時期	別紙のとおり						

令和3年度 港湾費負担金 繰越箇所位置図



皇后地区

長崎港 県事業 社会資本整備総合交付金





ガードパイプの発錆状況



ガードパイプの孔食状況

小ヶ倉柳地区


長崎港 県事業 社会資本整備総合交付金

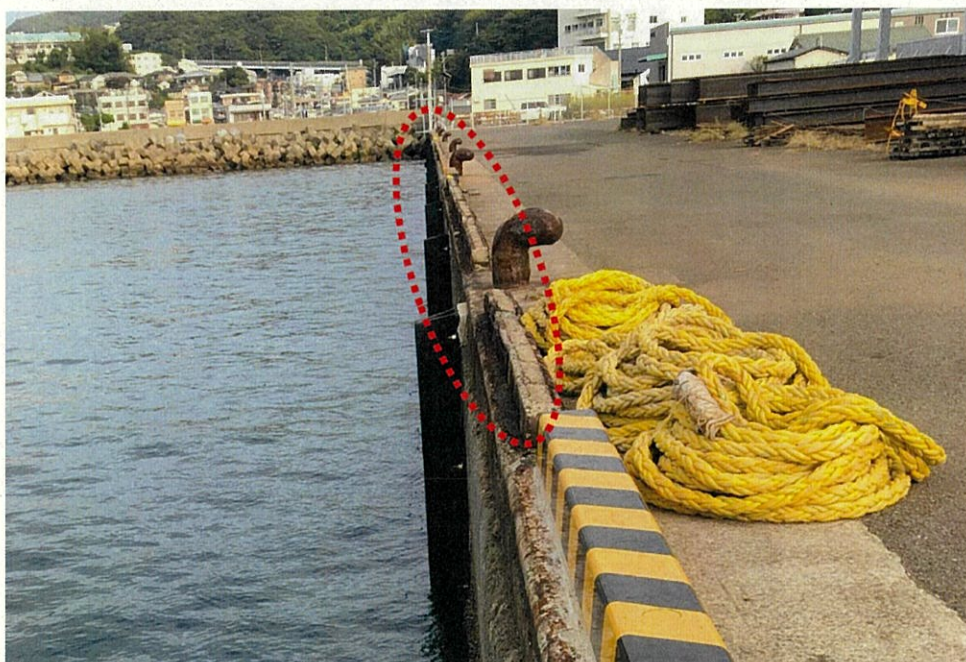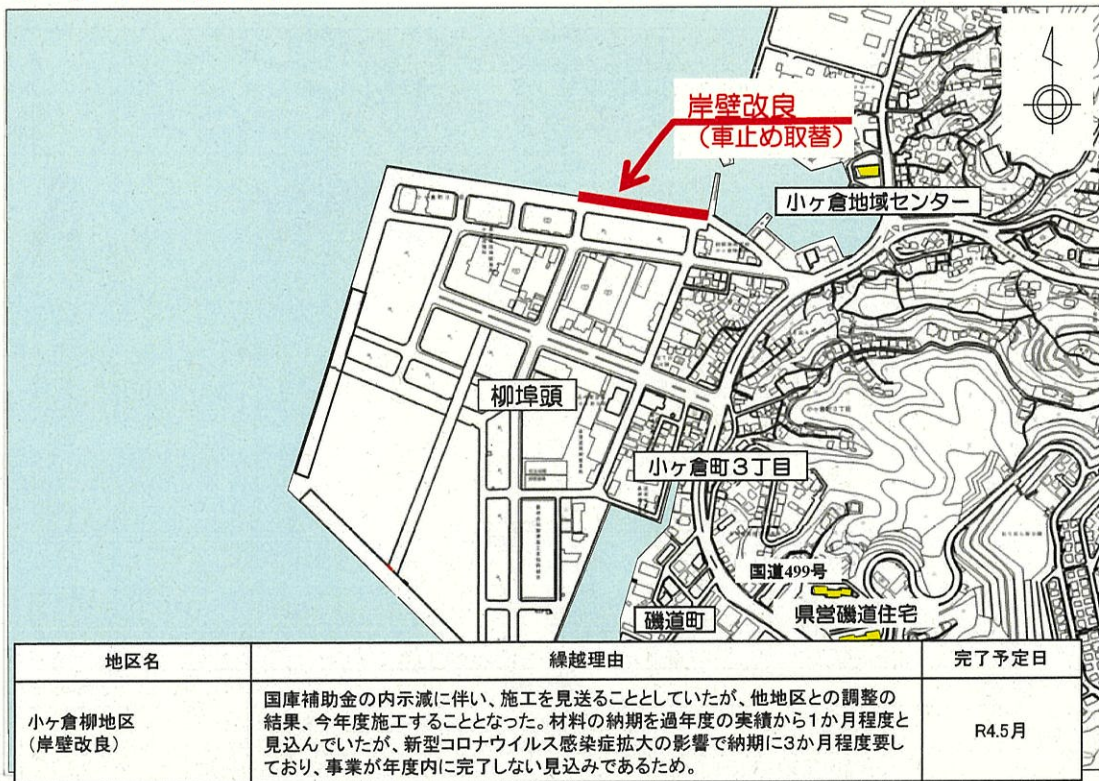

岸壁改良 (車止め取替)

松が枝地区

長崎港 県事業 社会資本整備総合交付金

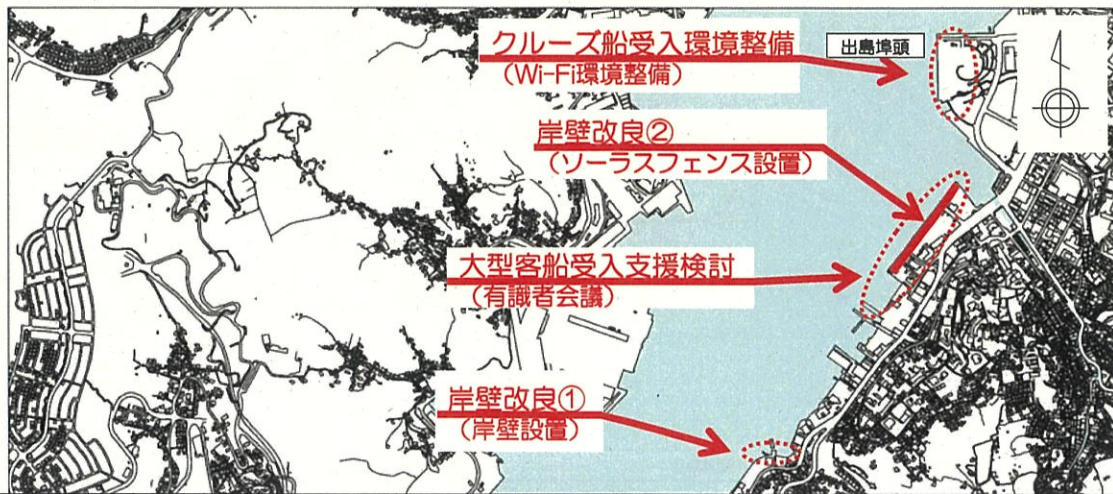

地区名	繰越理由	完了予定日
松が枝地区 (岸壁改良①)	工事において地盤改良を行う特殊な作業船が必要であるが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で特殊作業船の調達に不測の日数を要したことにより、事業が年度内に完了しない見込みであるため。	R4.11月
松が枝地区 (岸壁改良②)	国庫補助金の内示減に伴い、施工を見送ることとしていたが、他地区との調整の結果、今年度施工することとなった。岸壁改良工事(ソーラスフェンス設置)に際し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、国や長崎港アーバンデザイン会議の委員との協議に不測の日数を要しており、事業が年度内に完了しない見込みであるため。	R4.6月
松が枝地区 (クルーズ船受入環境整備)	新型コロナウイルス感染症拡大の影響で公衆無線Wi-Fi機器の半導体の調達に不測の日数を要しており、事業が年度内に完了しない見込みであるため。	R4.9月
松が枝地区 (大型客船受入支援検討)	クルーズ船社から女神大橋の桁下を通過できない大型客船を入港可能とする整備の要望があっており、有識者会議で検討する必要があるが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で会議や委員の日程の調整に不測の日数を要しており、事業が年度内に完了しない見込みであるため。	R5.3月



岸壁改良①




クルーズ船受入環境整備 (Wi-Fi環境整備)



岸壁改良② (ソーラスフェンス設置)、大型客船受入支援検討

元船、常盤・出島地区

長崎港 県事業 社会資本整備総合交付金

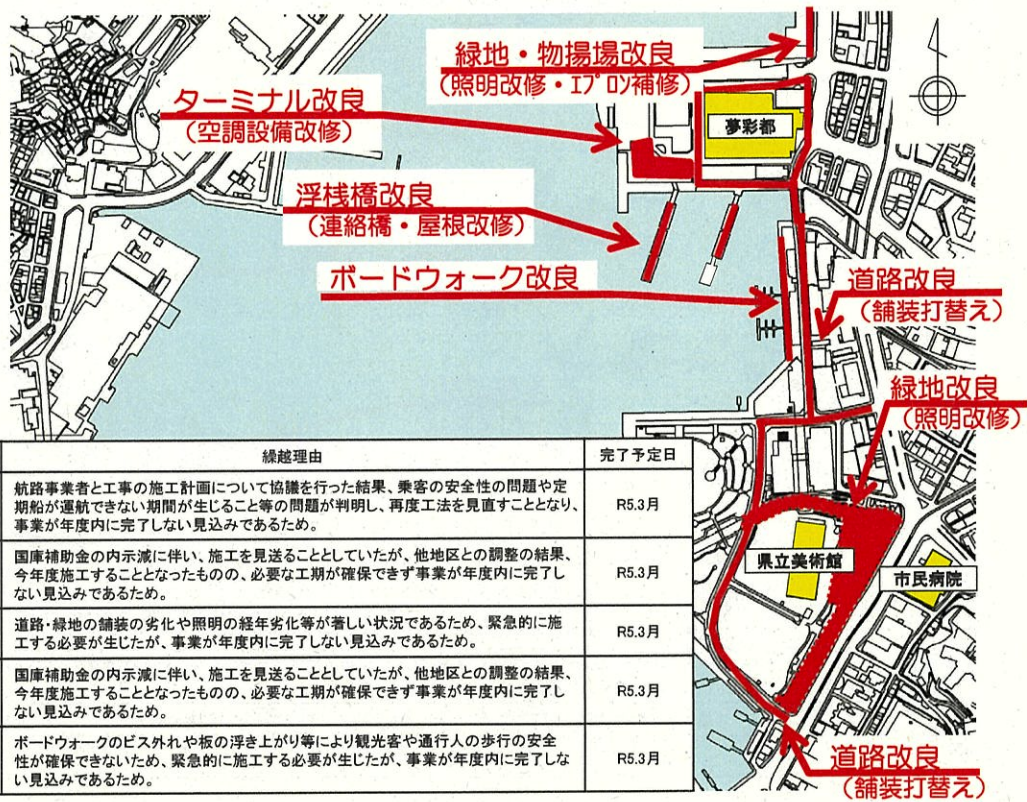

浮棧橋改良



物揚場改良



道路改良



ターミナル改良（空調設備工事）





ボードウォーク改良

福田地区

長崎港 県事業 社会資本整備総合交付金


地区名	繰越理由	完了予定日
福田地区 (緑地改良)	令和3年9月の台風により緑地内の芝生広場や通路に陥没が見受けられ、マリーナ利用者や観光客の安全な利用を確保するため緊急的に対策を実施することとしたが、調査設計において、陥没の規模など空洞状況の把握のためボーリングやファイバースコープ調査を追加したことにより、調査に不測の日数を要しており、事業が年度内に完了しない見込みであるため。	R5.3月



陥没状況

小ヶ倉・毛井首地区

長崎港 県事業 社会資本整備総合交付金

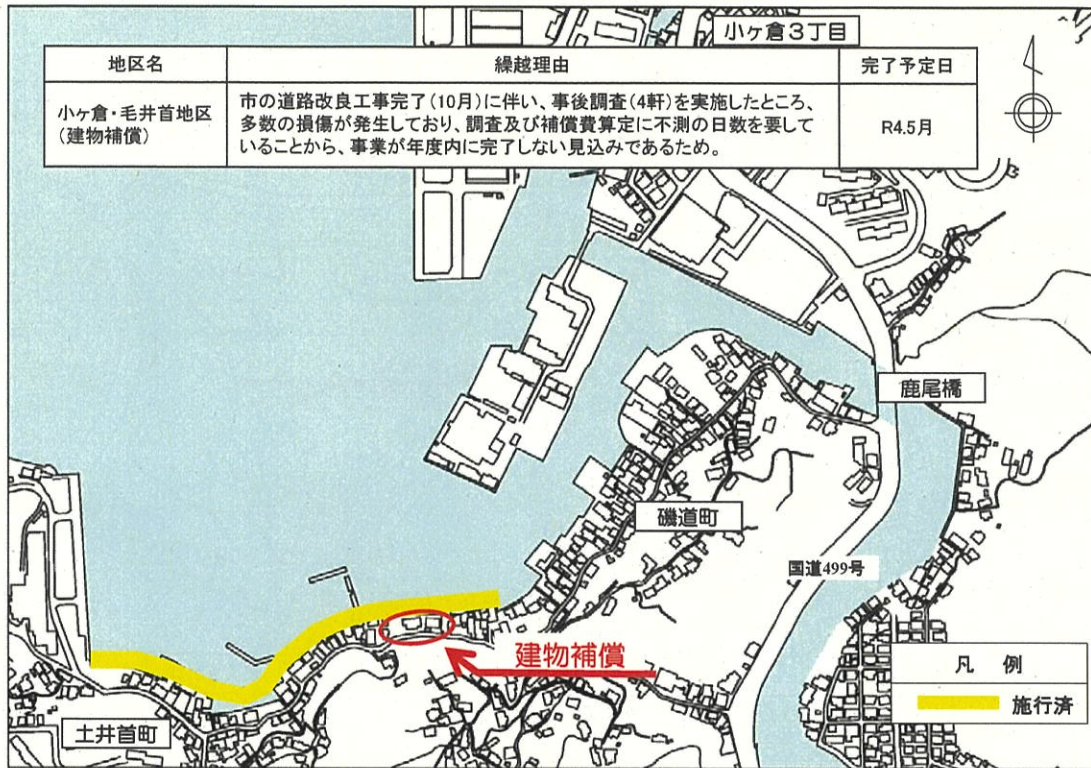

護岸及び市道整備の状況

かき道地区


東望港 県事業 社会資本整備総合交付金



護岸の状況

形上・大平地区


形上海岸 県事業 社会資本整備総合交付金

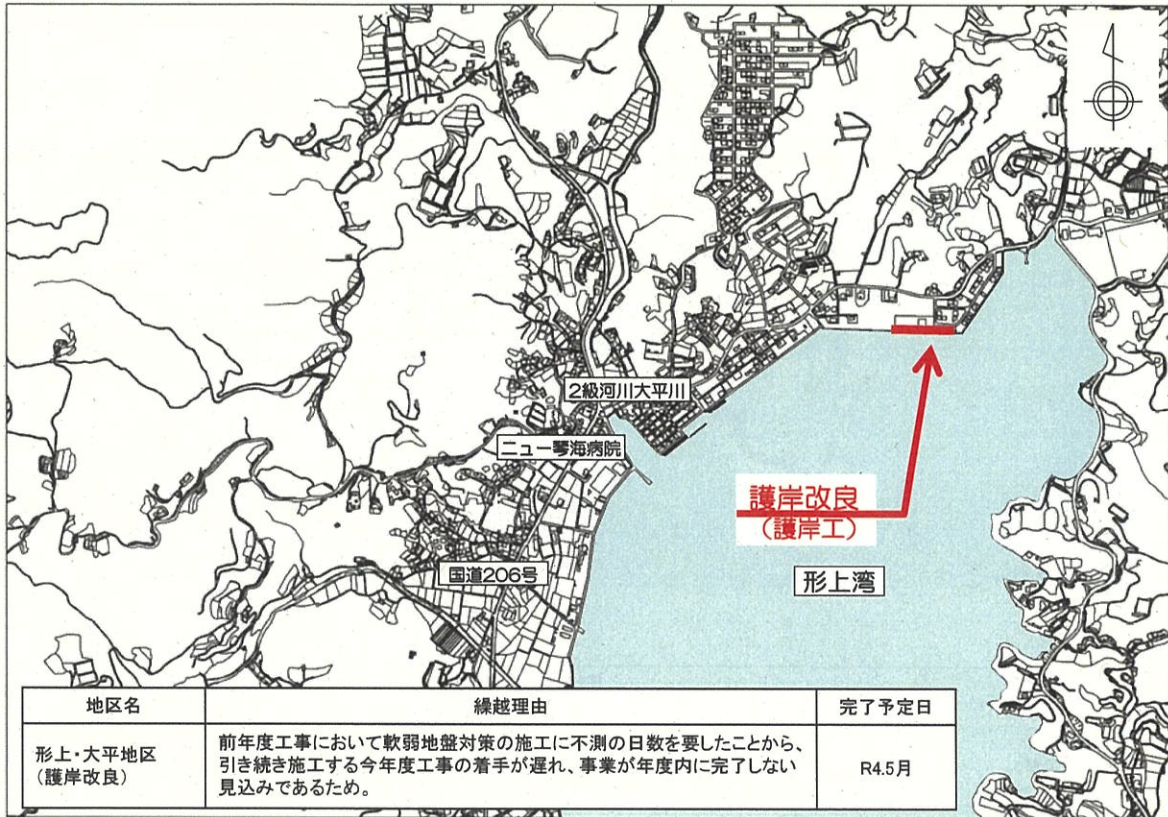

護岸の状況

香焼西地区

香焼西海岸 県事業 社会資本整備総合交付金

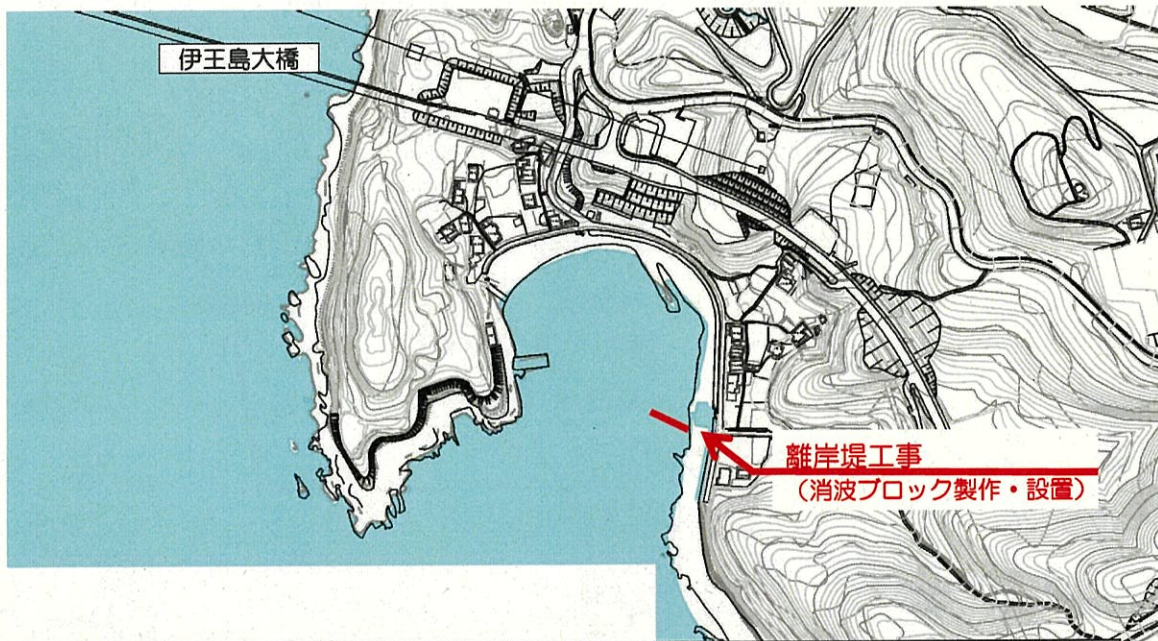



地区名	繰越理由	完了予定日
香焼西地区 (離岸堤工事)	当初から予定している測量設計が完了し、令和4年度に工事の施工を予定していたが、背後地が高潮被害を受けており、緊急性が高いことから、今年度予算の執行残と補正予算を合わせて工事を施工することとなったが、事業が年度内に完了しない見込みであるため。	R5.3月



整備箇所全景

高島地区


高島西海岸 県事業 社会資本整備総合交付金

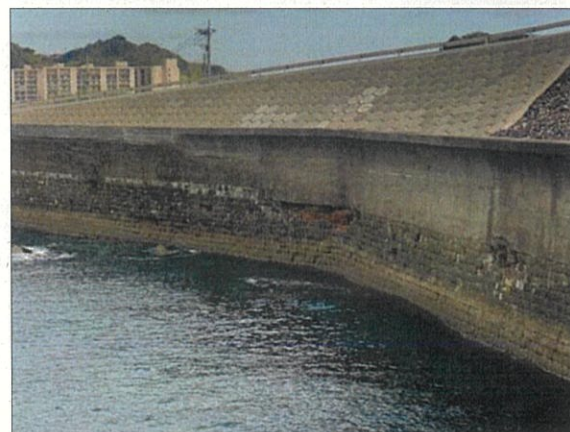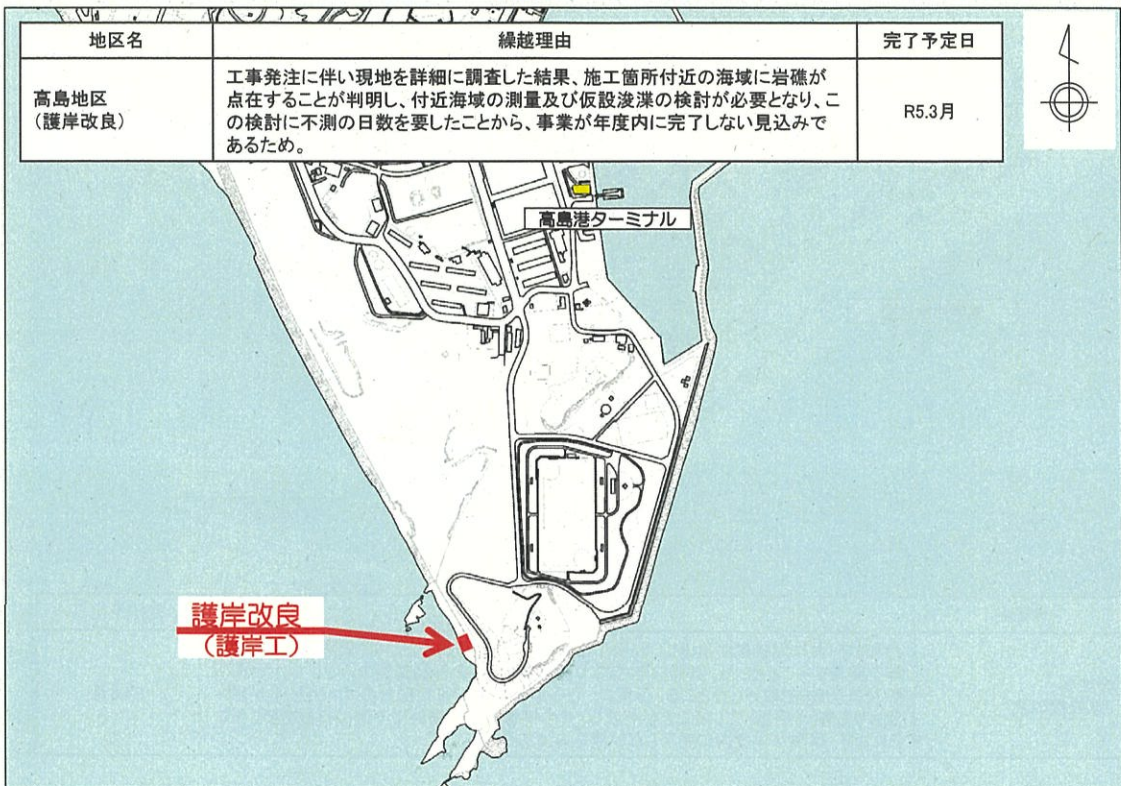


護岸の状況

岬地区

脇岬港 県単独事業

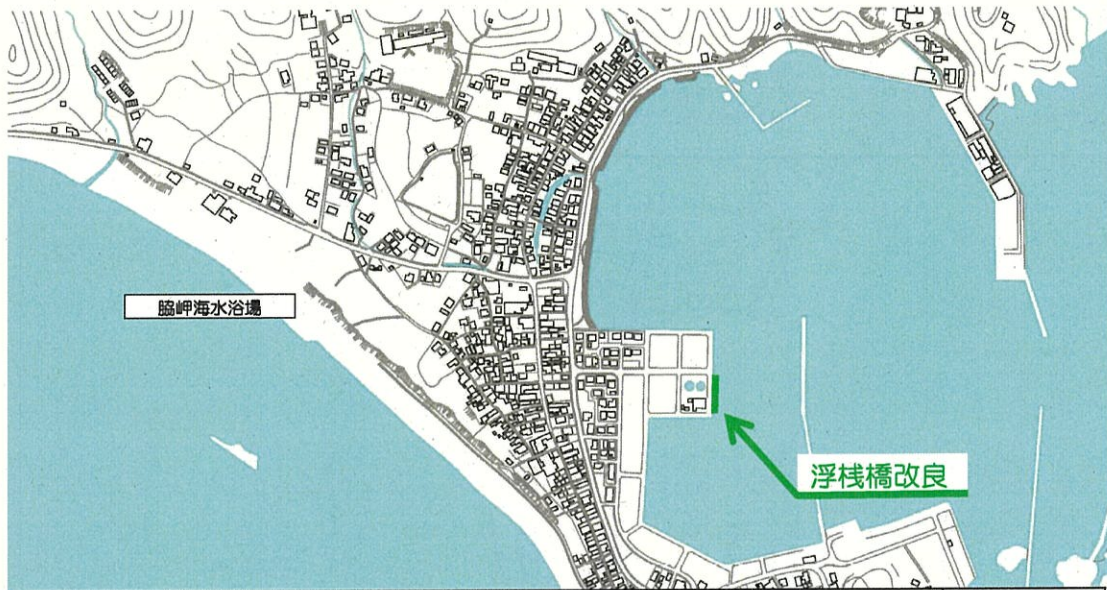

地区名	繰越理由	完了予定日
岬地区 (浮棧橋改良)	令和3年1月に浮棧橋が損傷し、利用が出来ない状況であることから、緊急的に改良工事を実施することとした。当初は浮棧橋の係留ローラーの部品交換のみとしていたが、係留ローラーを取外したところ、係留ローラー取付部の不可視部分のコンクリートが想定よりも著しく損傷していることが判明し、その補修方法の検討に不測の日数を要したことにより、事業が年度内に完了しない見込みであるため。	R4.6月

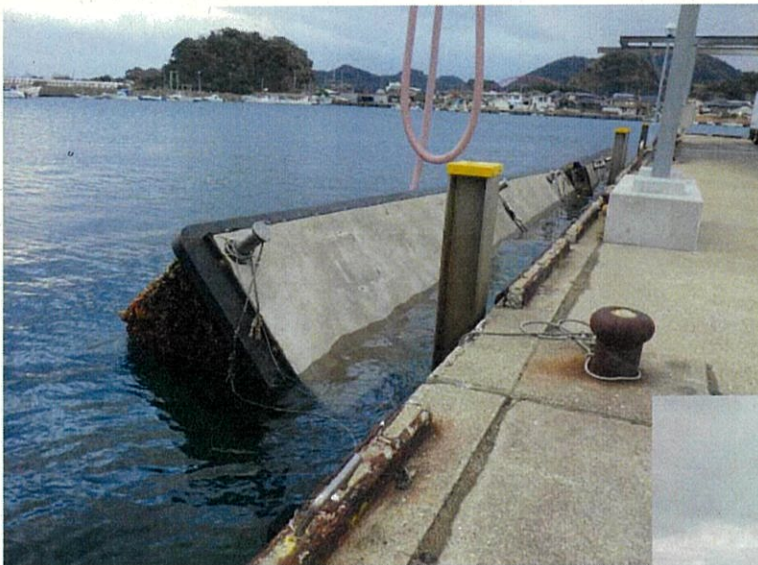

浮棧橋の陸揚げ状況

【繰越明許費】予算説明書 54～55 ページ

8款 土木費 5項 都市計画費 1目 都市計画総務費

(単位:千円)


事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
歴史的風致維持 向上推進費	予算現額	3,109	-	-	-	-	3,109
	支出予定額	1,109	-	-	-	-	1,109
	繰越明許額	2,000	-	-	-	-	2,000
繰越事由	重点区域(東山手・南山手区域)歴史まちづくり計画の策定に係る地元との協議等が、新型コロナウイルス感染拡大の影響で遅延したことにより、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の 完了予定時期	令和4年6月末						

スケジュール

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度
重点区域歴史まちづくり 計画策定	●——●	●——●	
重点区域歴史まちづくり 実施計画策定		●——●	●——●

●——●:当初 ●——●:変更 ●——●:変更(繰越)

重点区域歴史まちづくり実施計画策定区域図

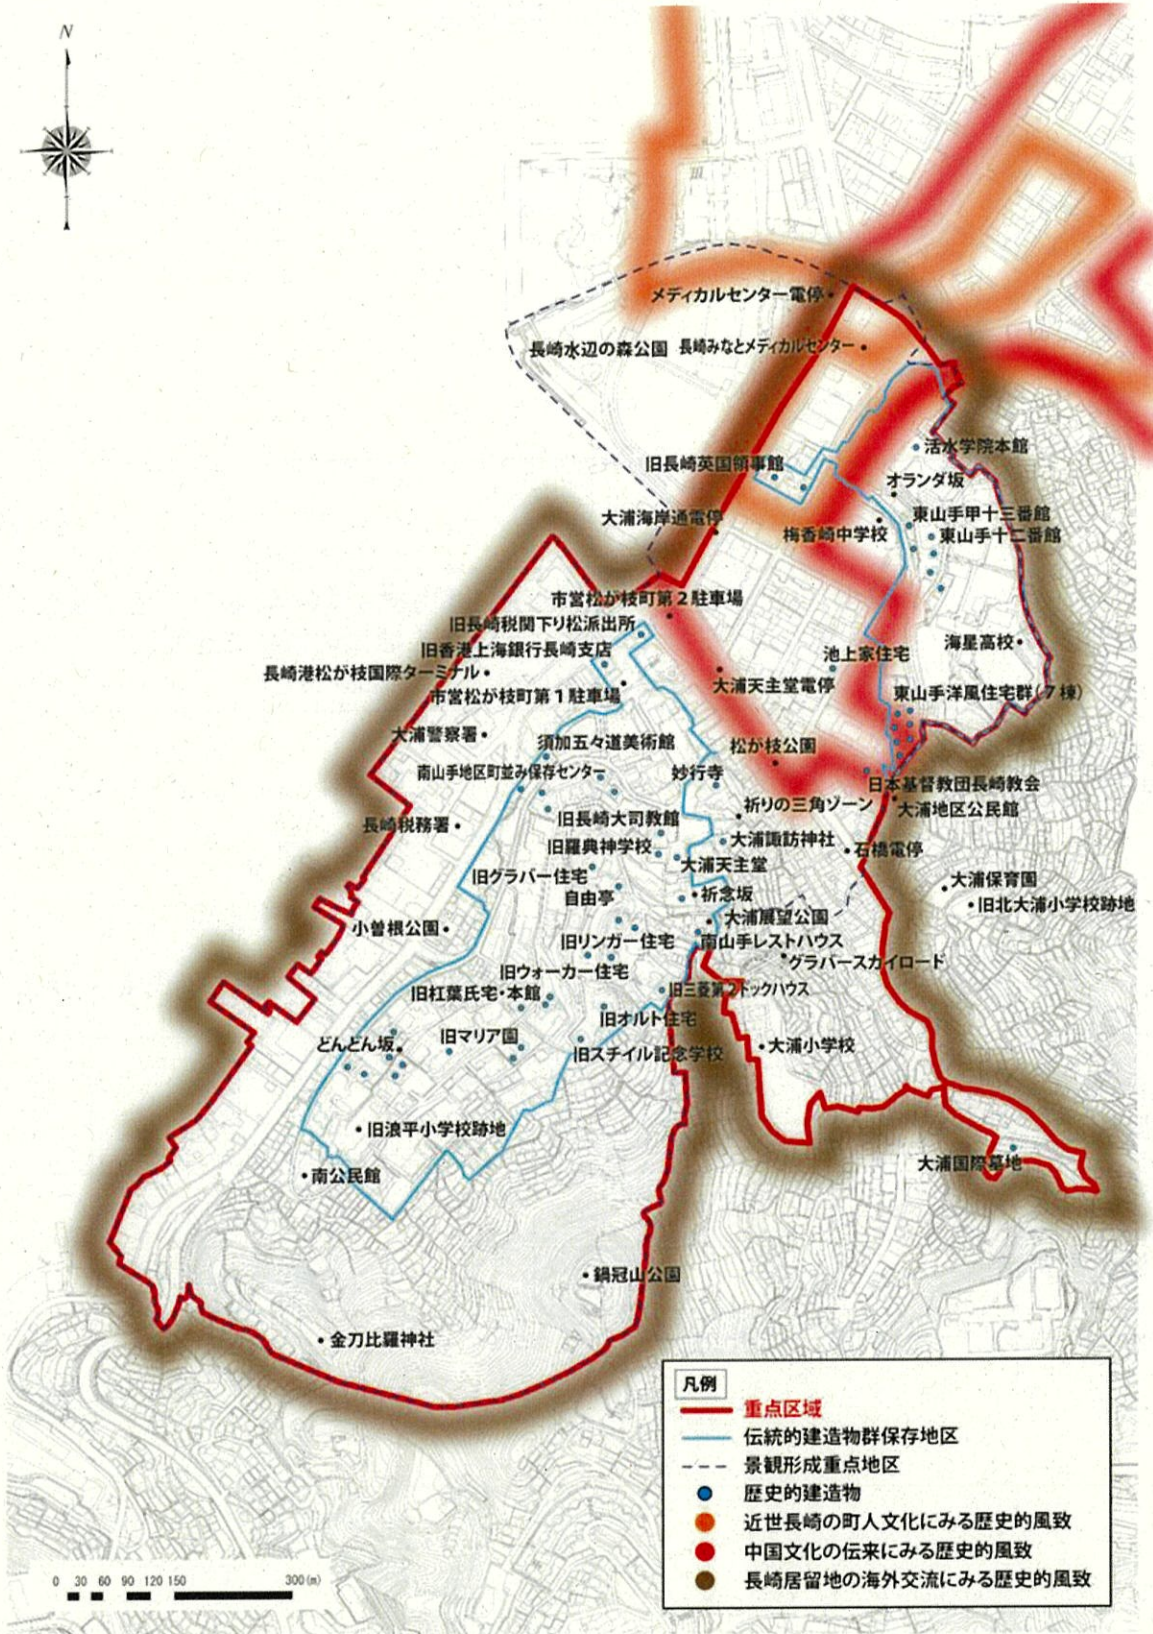


【繰越明許費】予算説明書 54～55 ページ

8款 土木費 5項 都市計画費 1目 都市計画総務費

(単位:千円)


事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】新幹線整備推進事業費 九州新幹線西九州ルート建設 事業費負担金 [事業期間]H24～R7年度 [総事業費]約6,200億円 [進捗率]94%(R4.3月末)	予算現額	552,300	-	-	459,600	-	92,700
	支出予定額	453,600	-	-	370,800	-	82,800
	繰越明許額	98,700	-	-	88,800	-	9,900
繰越事由	水路復旧や道路切替工事等において、関係機関との協議に不測の日数を要したことなどにより、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定時期	令和4年8月						

工事スケジュール

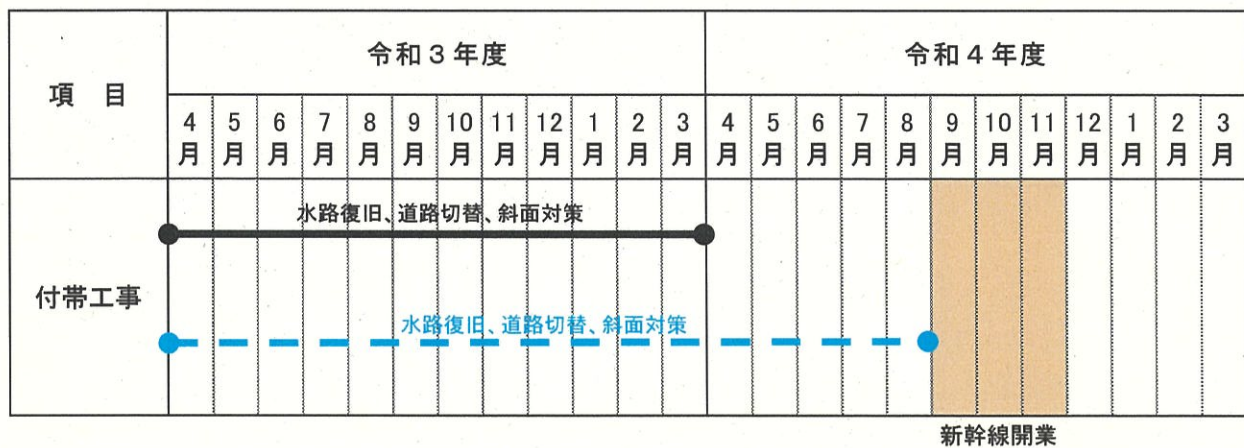

●——● : 当初 ●——● : 変更(繰越)

令和3年度繰越予定箇所

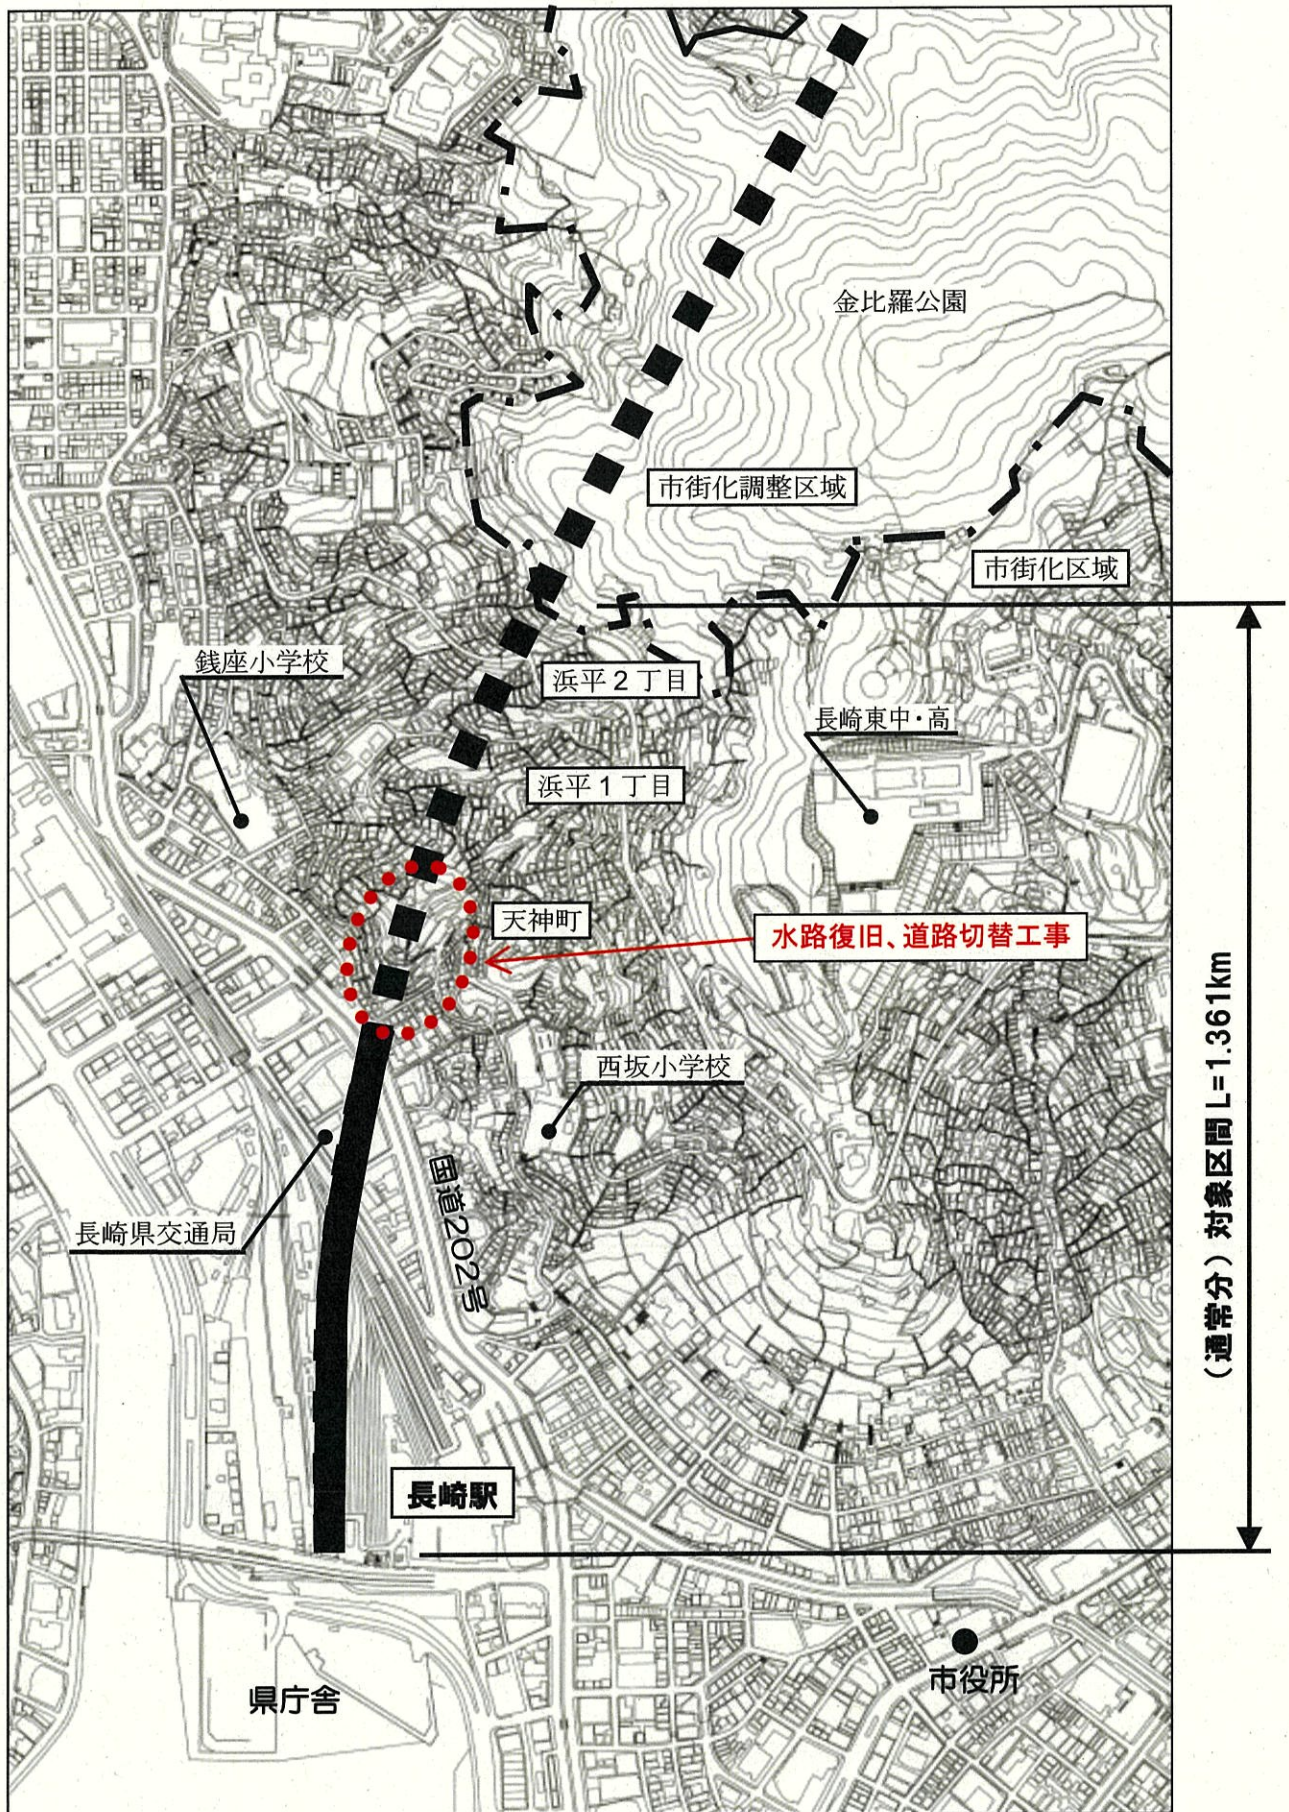

【繰越明許費】予算説明書 56～57 ページ

8款 土木費 5項 都市計画費 2目 都市開発費

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】市街地再開発事業費 新大工町地区 〔事業期間〕 H25～R4 〔進捗率〕 38.0% (R3.3 末)	予算現額	1,752,000	875,445	187,115	611,700	-	77,740
	支出予定額	1,139,600	569,245	126,315	390,900	-	53,140
	繰越明許額	612,400	306,200	60,800	220,800	-	24,600
繰越事由	補助事業者である新大工町地区市街地再開発組合が行う建物工事において、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、資材搬入の遅れが生じ、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定時期	令和4年7月						

スケジュール




●—● : 当初 ●- - -● : 変更

北街区
(26階立上完了)



令和3年度繰越予定箇所

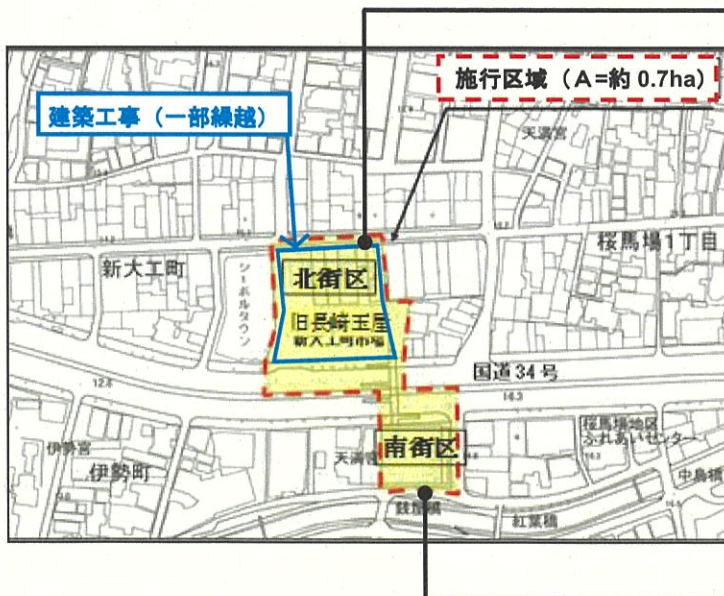

南街区
(完成)



【繰越明許費】 予算説明書 56～57 ページ

8 款 土木費 5 項 都市計画費 2 目 都市開発費

(単位:千円)


事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】市街地再開発事業費 新大工歩道橋 〔事業期間〕R2～R4 年度 〔進捗率〕5.1% (R3.3 末)	予算現額	106,200	41,000	-	37,000	24,000	4,200
	支出予定額	0	0	-	0	0	0
	繰越明許額	106,200	41,000	-	37,000	24,000	4,200
繰越事由	令和3年度から令和4年度にかけて施工予定の新大工歩道橋整備工事において、受注者が令和3年度に支払予定の前払い金の請求を行わないため、翌年度に支払う必要が生じたことなどにより、予算の執行が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定時期	令和4年11月						

スケジュール

事業内容／年度	令和3年度						令和4年度						
	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	
歩道橋工事						●	●	●	●	●	●	●	●
支障物件移設補償						●	●						

★供用開始 (10月末)

令和3年度繰越予定箇所

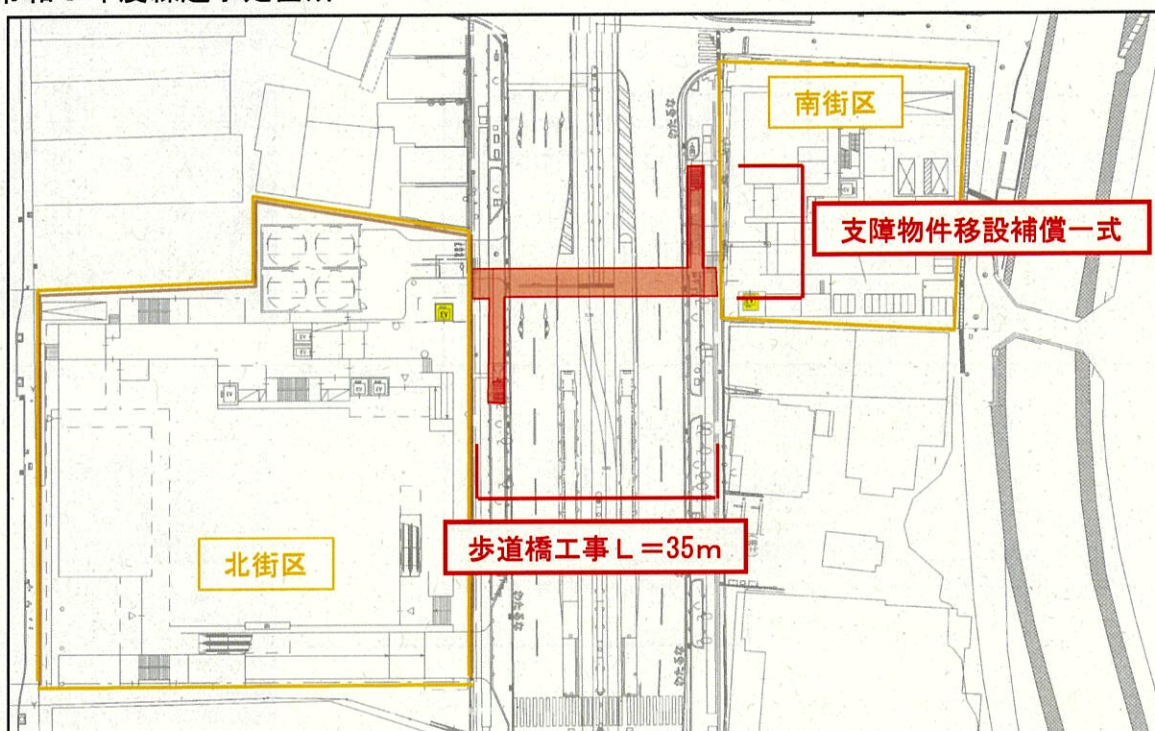

【繰越明許費】予算説明書 56～57 ページ

8款 土木費 5項 都市計画費 2目 都市開発費

(単位:千円)


事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】土地区画整理事業費 東長崎平間・東地区	予算現額	182,100	-	-	113,900	18,813	49,387
	支出予定額	145,100	-	-	86,200	18,813	40,087
	繰越明許額 (11月補正)	17,000	-	-	12,700	-	4,300
	繰越明許額 (2月補正)	20,000	-	-	15,000	-	5,000
	繰越明許額 合計	37,000	-	-	27,700	-	9,300
事業概要	繰越事由						
東長崎平間・東地区 土地区画整理事業 [事業期間]H14～R8年度 [事業計画]施行面積 30.0ha [総事業費]11,000,000 千円 [進捗率]97%(R3.3月末)	<p>●工事請負費 入札不調及び関係機関との調整に不測の日数を要したことにより、工事が年度内に完了しない見込みであるため。</p>						
繰越箇所の完了予定時期	令和4年7月						

1 繰越明許額の内訳

(単位:千円)


事業名	節	金額	備考
【単独】土地区画整理事業費 東長崎平間・東地区	工事請負費	20,000	道路改良工事ほか
	合計	20,000	

2 事業スケジュール

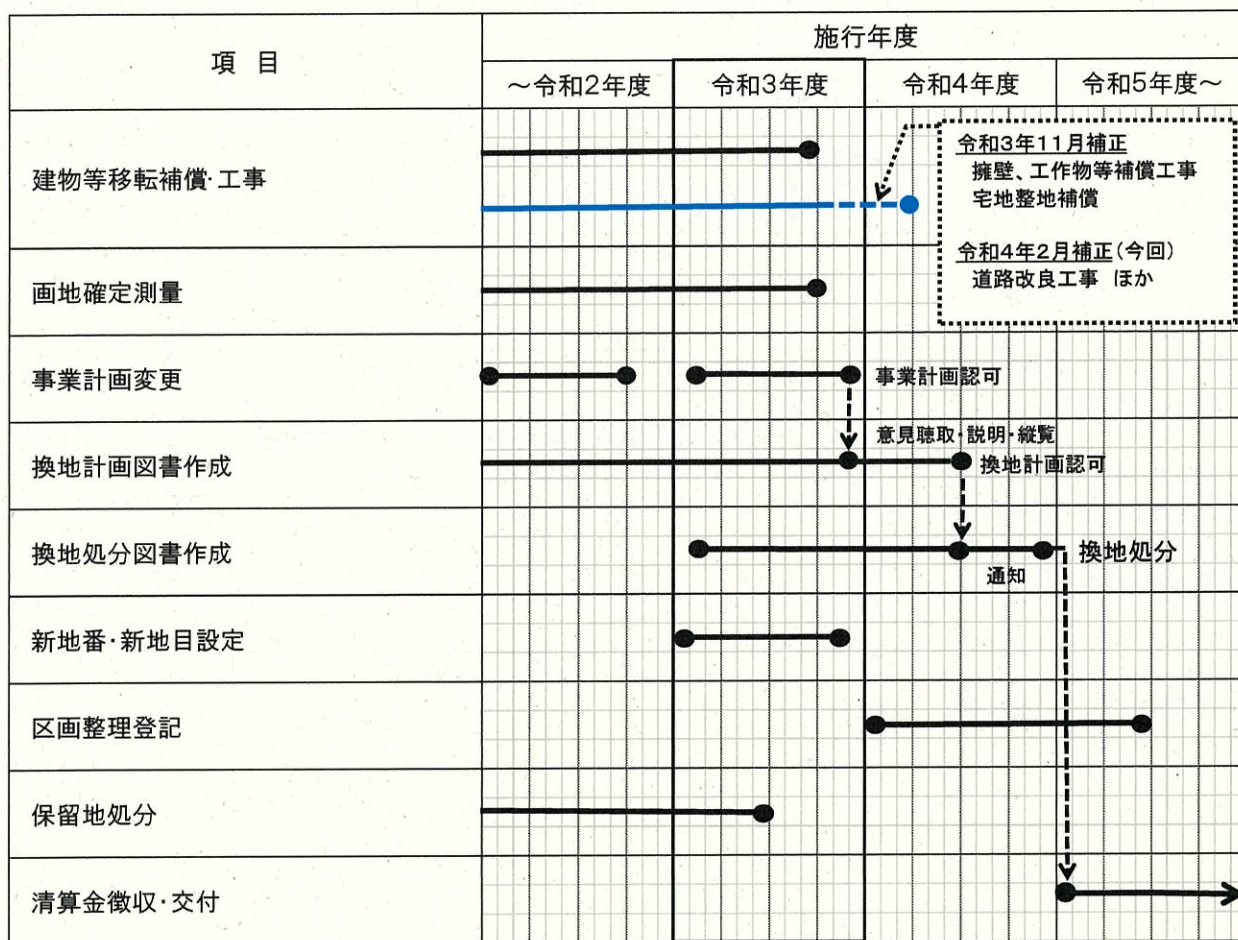

令和3年度 土地区画整理事業(平間・東地区)繰越予定箇所 (R4.2)

凡例	
測量費	
用地費	
補償費	
工事費	
負担金	

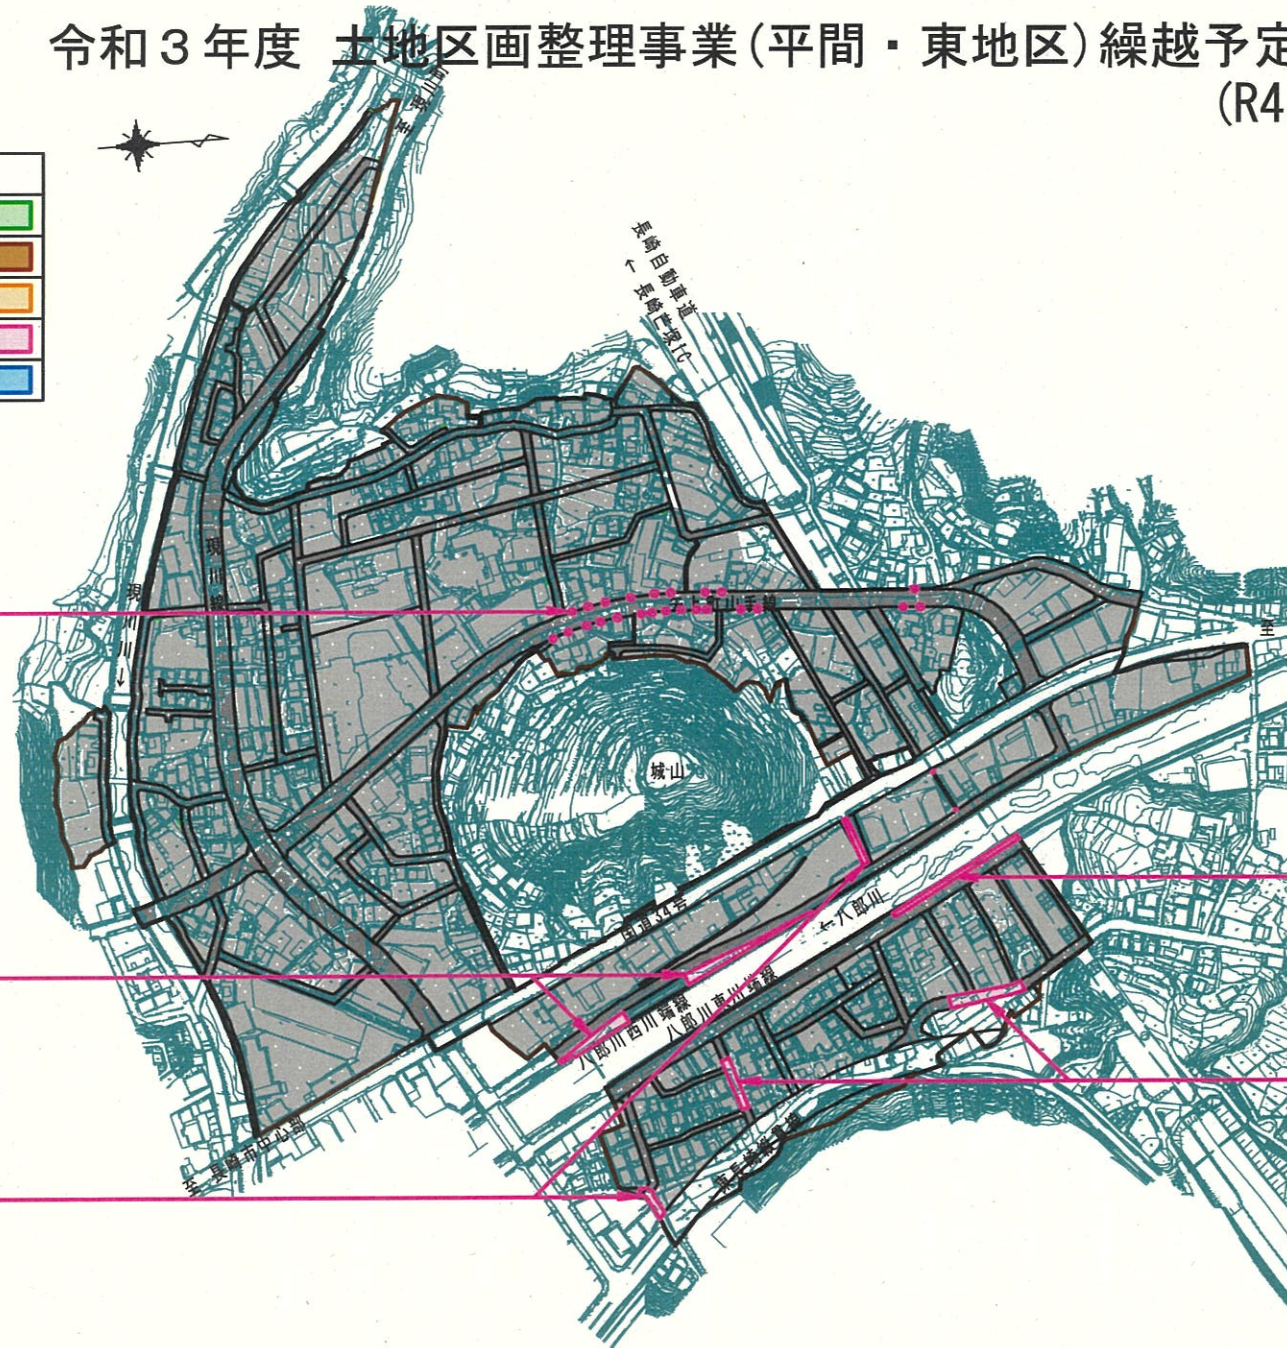

矢上町山手線道路植栽工事

八郎川東川端線道路改良工事

2号緑地整備工事

8-3号線ほか道路改良その他工事

6-21号線ほか道路改良その他工事

【繰越明許費】予算説明書 58～59 ページ

8款 土木費 5項 都市計画費 7目 県施行事業費負担金

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
都市計画費負担金 JR長崎本線連続立体 交差事業費	予算現額	21,590	-	-	19,300	-	2,290
[事業期間]H21～R3年度 (延伸予定)	支出予定額	0	-	-	0	-	0
[事業計画]事業区間 約 2,480m [総事業費]約 529 億円 [進捗率]98% (R4.3 月末)	繰越明許額	21,590	-	-	19,300	-	2,290
繰越事由	同事業の中で行う東通り線をはじめとする側道の整備工事が、関係者との調整に不測の日数を要しており、その後に予定している事後補償や環境調査委託が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の 完了予定時期	令和5年3月						

・工事スケジュール

項目	令和3年度	令和4年度
事後補償、環境調査委託	●————●	●-----●


●————● : 当初 ●-----● : 変更(繰越)

都市計画費負担金

JR長崎本線連続立体交差事業(松山町～尾上町)平面図



L=2,480m

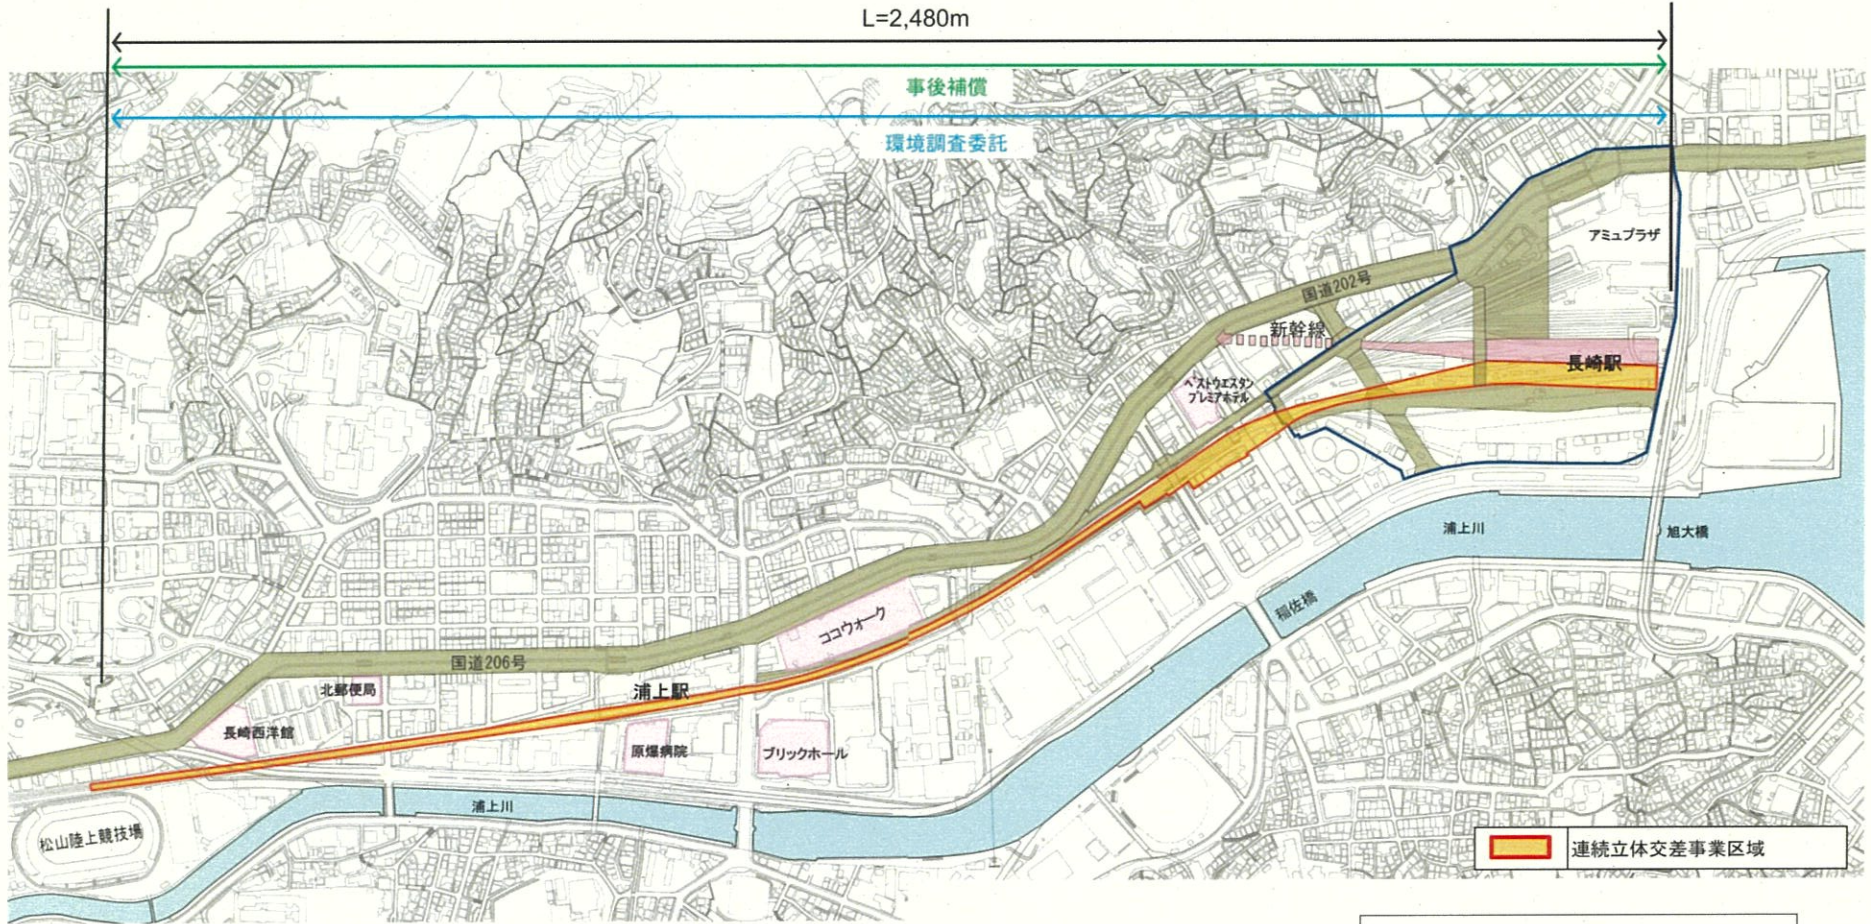

連続立体交差事業区域

凡 例	
緑文字	補助分
青文字	旧地方特定道路整備事業費
