

第146号議案

令和元年度長崎市一般会計補正予算(第5号)

目次	ページ
【繰越明許費】	
《8款 土木費 2項 道路橋りょう費》	
繰越明許費位置図 1
3目 道路橋りょう新設改良費(土木建設課) 2 ~ 7
《8款 土木費 5項 都市計画費》	
繰越明許費位置図 8
3目 街路事業費(土木建設課) 9 ~ 11
6目 公園費(土木建設課) 12
【債務負担行為】	
《8款 土木費 5項 都市計画費》	
1目 都市計画総務費(土木企画課)	
・築町二輪車等駐車場指定管理 13 ~ 14
3目 街路事業費(土木建設課)	
・都市計画街路整備事業(銅座町松が枝町線) 15 ~ 16

土木部

令和元年11月




【繰越明許費】予算説明書48～51ページ

8款 土木費 2項 道路橋りょう費

※ 土木建設課

(単位:千円)

	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8款 2項 繰越明許費	予算現額	811,500	374,600	0	393,100	0	43,800
合計	支出予定額	521,500	252,750	0	241,900	0	26,850
	繰越明許額	290,000	121,850	0	151,200	0	16,950

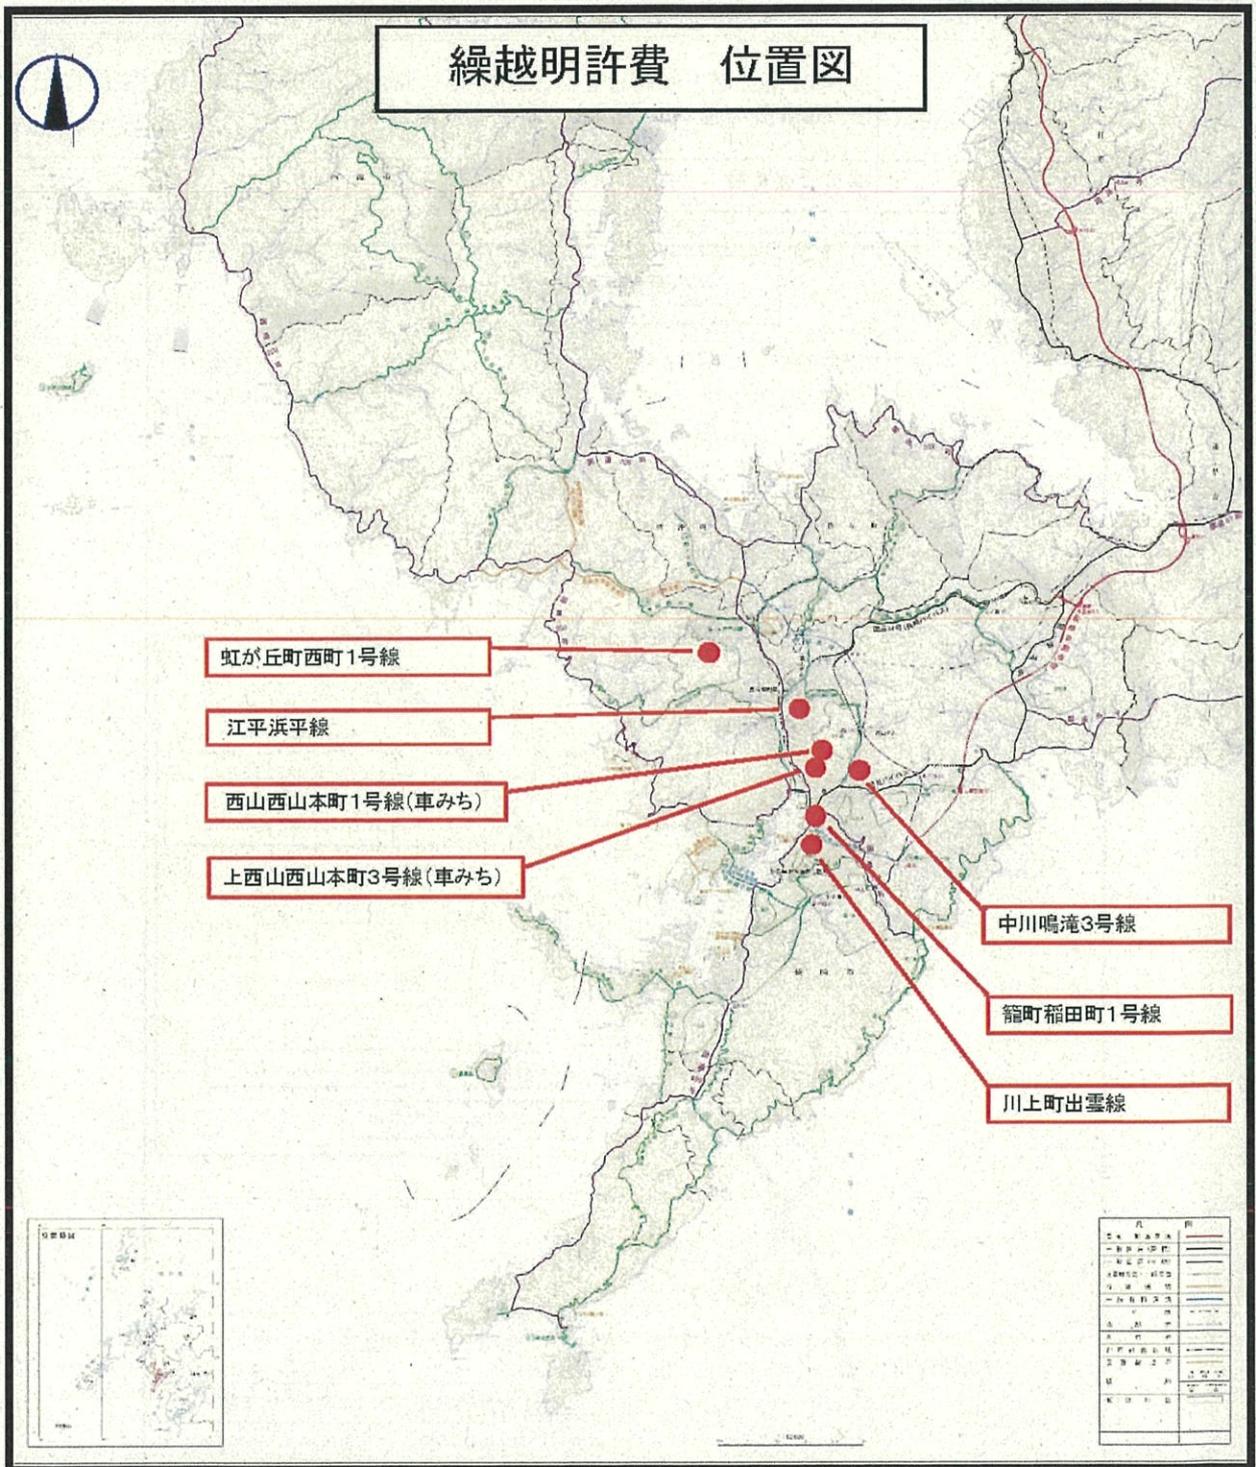


8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費

※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】道路新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金) 江平浜平線	予算現額	463,000	230,000	0	209,700	0	23,300
【事業期間】H9～R5年度 【事業計画】延長 L=2,260m 幅員 W=9.75m	支出予定額	331,500	165,000	0	149,900	0	16,600
【総事業費】3,900,000千円 【進捗率】67%(H31年3月末)	繰越明許額	131,500	65,000	0	59,800	0	6,700
繰越事由	道路改良工事と併行して整備が必要な河川工事の施工範囲の検討に日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和2年9月						

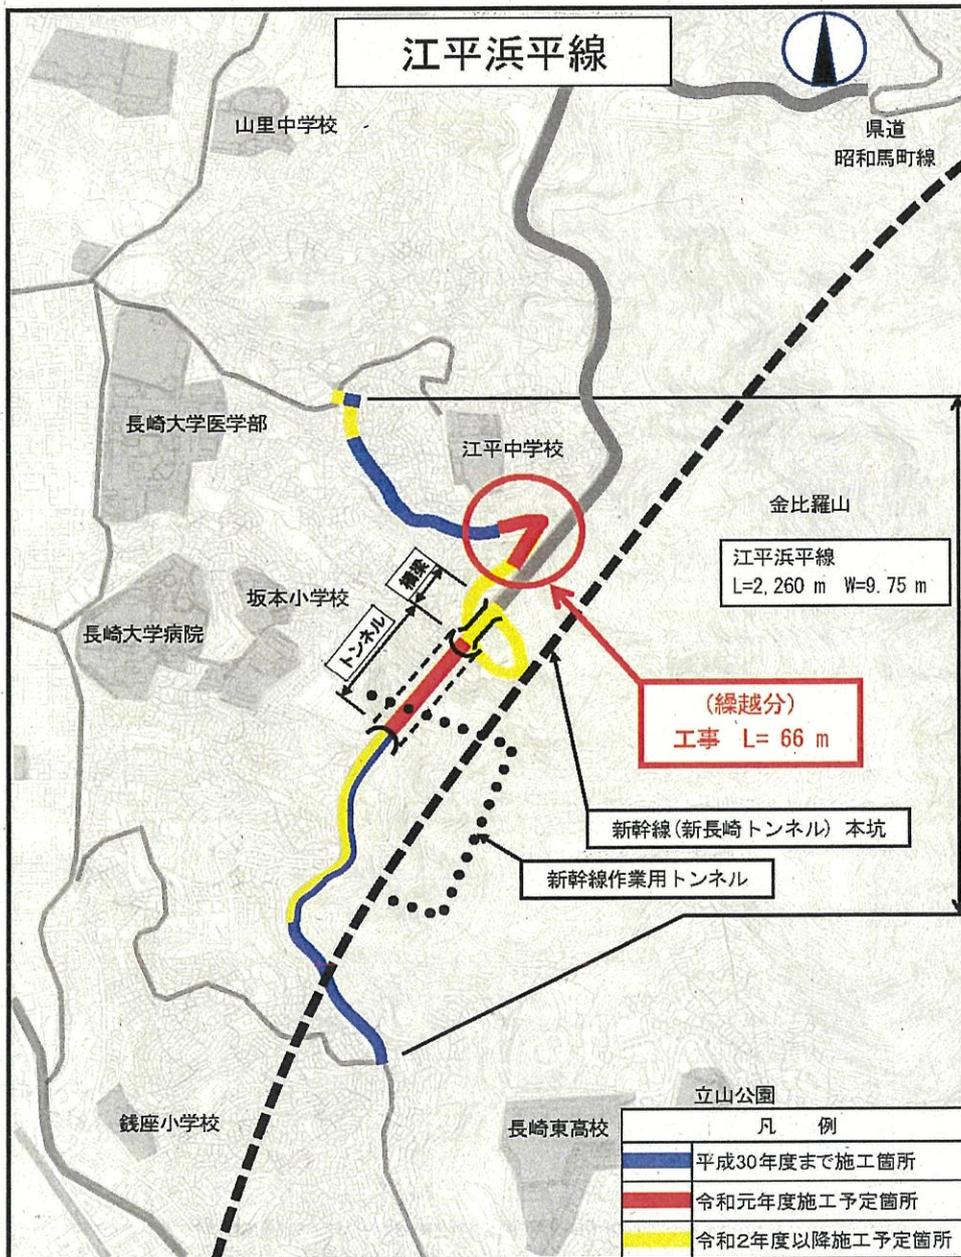

8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費
 ※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】道路新設改理事業費 (社会資本整備総合交付金) 中川鳴滝3号線	予算現額	105,000	50,000	0	49,500	0	5,500
	支出予定額	95,600	45,500	0	45,100	0	5,000
	線越明許額	9,400	4,500	0	4,400	0	500
線越事由	地権者1名との用地交渉に不測の日数を要し、用地取得及び建物補償が年度内に完了しない見込みであるため。						
線越箇所の完了予定	令和2年5月						



8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費

※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】道路新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金) 川上町出雲線	予算現額	20,000	9,600	0	9,300	0	1,100
【事業期間】H3～R5年度 【事業計画】延長 L=576m 幅員 W=10.5m	支出予定額	12,800	6,000	0	6,100	0	700
【総事業費】1,600,000千円 【進捗率】85%(H31年3月末)	繰越明許額	7,200	3,600	0	3,200	0	400
繰越事由	電柱等の支障物件において、移設箇所の選定に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和2年6月						



8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費
 ※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】道路新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金) 籠町稲田町1号線(電線類地中化) 【事業期間】H29～R2年度 【事業計画】延長 L=250m 【総事業費】310,000千円 【進捗率】31%(H31年3月末)	予算現額	31,500	15,000	0	14,800	0	1,700
	支出予定額	23,500	11,250	0	11,000	0	1,250
	繰越明許額	8,000	3,750	0	3,800	0	450
繰越事由	新地町稲田町線街路整備事業の用地交渉に不測の日数を要し、道路工事の完了が遅れたことにより、電線類地中化に係る工事着手が遅れ、年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和2年9月						




8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費

※ 土木建設課

(単位:千円)


事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】道路新設改良事業費 (地方創生道整備推進交付金) 虹が丘町西町1号線	予算現額	142,000	70,000	0	64,800	0	7,200
【事業期間】H9～R7年度 【事業計画】延長 L=1,950m 幅員 W=10m	支出予定額	52,000	25,000	0	24,300	0	2,700
【総事業費】4,000,000千円 【進捗率】55%(H31年3月末)	繰越明許額	90,000	45,000	0	40,500	0	4,500
繰越事由	掘削工事において、岩盤が想定以上に硬く、掘削に日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和2年5月						

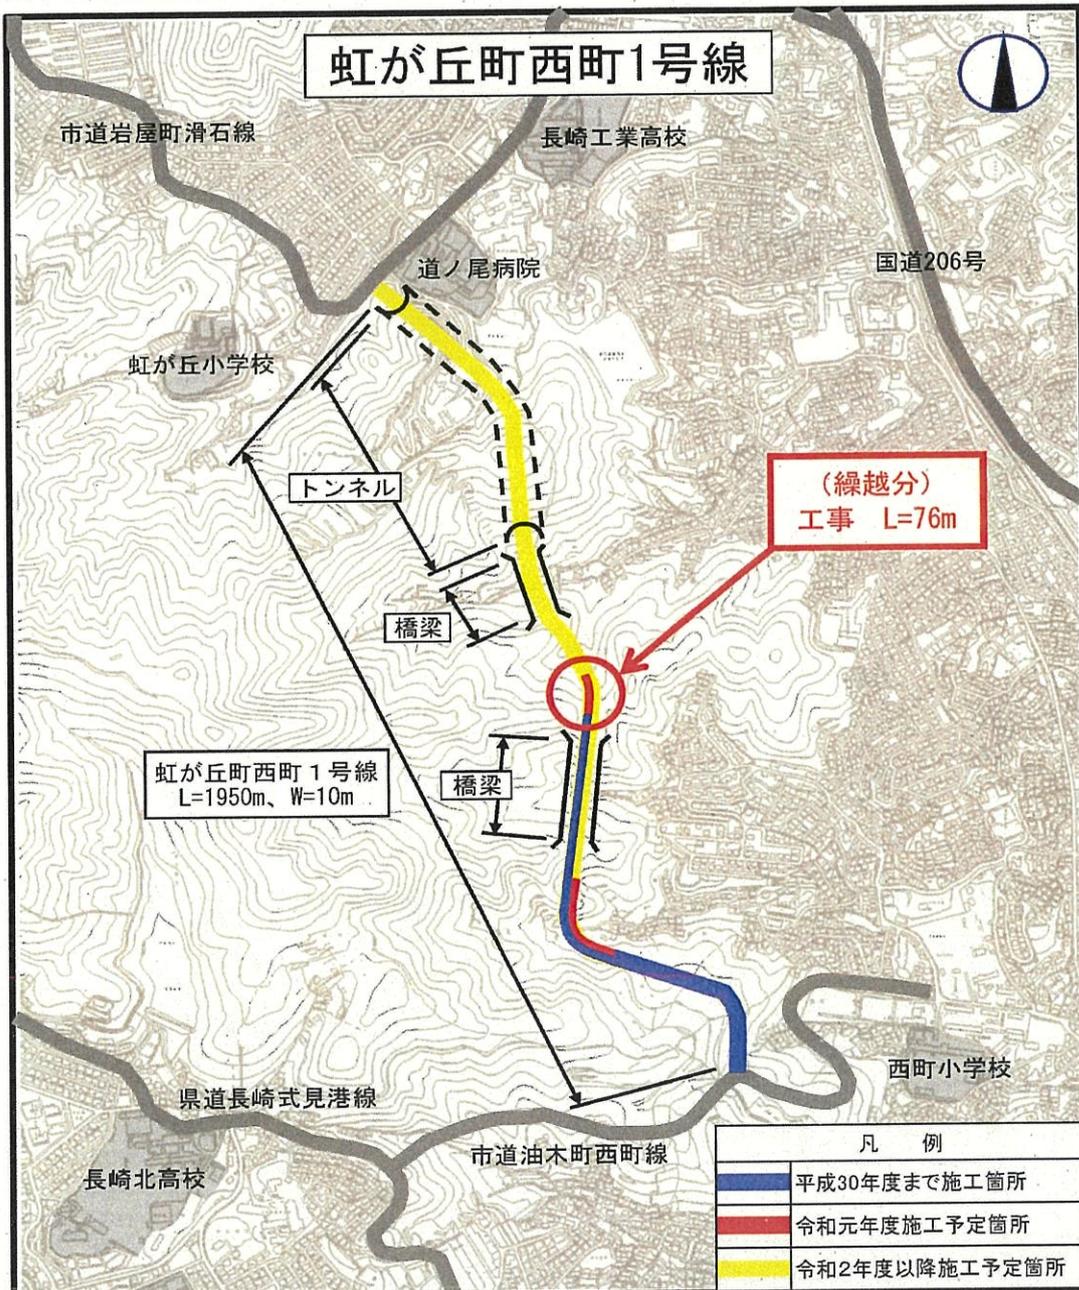

8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費
 ※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】道路新設改良事業費 車みち整備事業費	予算現額	50,000	0	0	45,000	0	5,000
【事業期間】R1～R5年度 【事業延長】L=1,000m 【総事業費】380,000千円	支出予定額	6,100	0	0	5,500	0	600
	繰越明許額	43,900	0	0	39,500	0	4,400
繰越事由	工事の実施については、地域全体での同意を得ているものの、個別の敷地との調整に時間を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和2年9月						

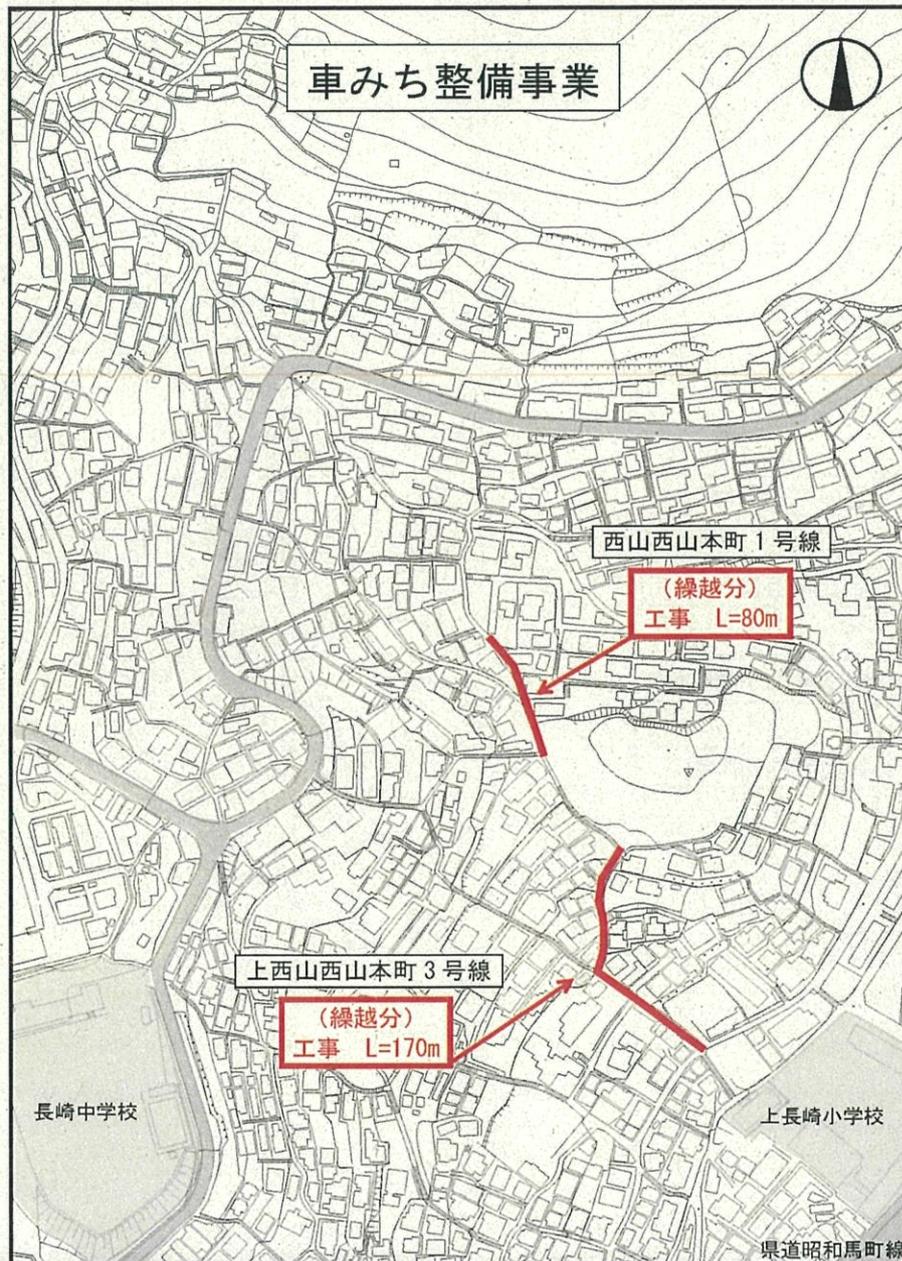

8款 土木費 5項 都市計画費 3目 街路事業費

※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】都市計画街路整備事業費 (社会資本整備総合交付金) 新地町稲田町線	予算現額	105,000	50,000	0	49,500	0	5,500
【事業期間】H12～R4年度 【事業計画】延長 L=400m 幅員 W=15m	支出予定額	95,700	45,600	0	45,100	0	5,000
【総事業費】4,100,000千円 【進捗率】76%(H31年3月末)	繰越明許額	9,300	4,400	0	4,400	0	500
繰越事由	地権者2名との用地交渉に不測の日数を要し、建物補償が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和2年9月						



8款 土木費 5項 都市計画費 3目 街路事業費

※ 土木建設課

(単位:千円)


事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】都市計画街路整備事業費 (社会資本整備総合交付金) 道の尾駅前線 【事業期間】H22～R2年度 【事業計画】延長 L=200m 幅員 W=12m 【総事業費】1,200,000千円 【進捗率】40%(H31年3月末)	予算現額	20,000	9,500	0	9,400	0	1,100
	支出予定額	8,400	4,000	0	4,000	0	400
	繰越明許額	11,600	5,500	0	5,400	0	700
繰越事由	国道206号の道路管理者や交通管理者などの関係機関との交差点協議に不測の日数を要し、交通解析委託が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和2年6月						



8款 土木費 5項 都市計画費 3目 街路事業費
 ※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】都市計画街路整備事業費 (社会資本整備総合交付金) 銅座町松が枝町線(銅座工区)	予算現額	312,000	151,000	0	144,900	0	16,100
	支出予定額	106,000	53,000	0	47,700	0	5,300
	線越明許額	206,000	98,000	0	97,200	0	10,800
線越事由	地権者1名との用地交渉に不測の日数を要し、用地取得及び建物補償が年度内に完了しない見込みであるため。						
線越箇所の完了予定	令和2年9月						

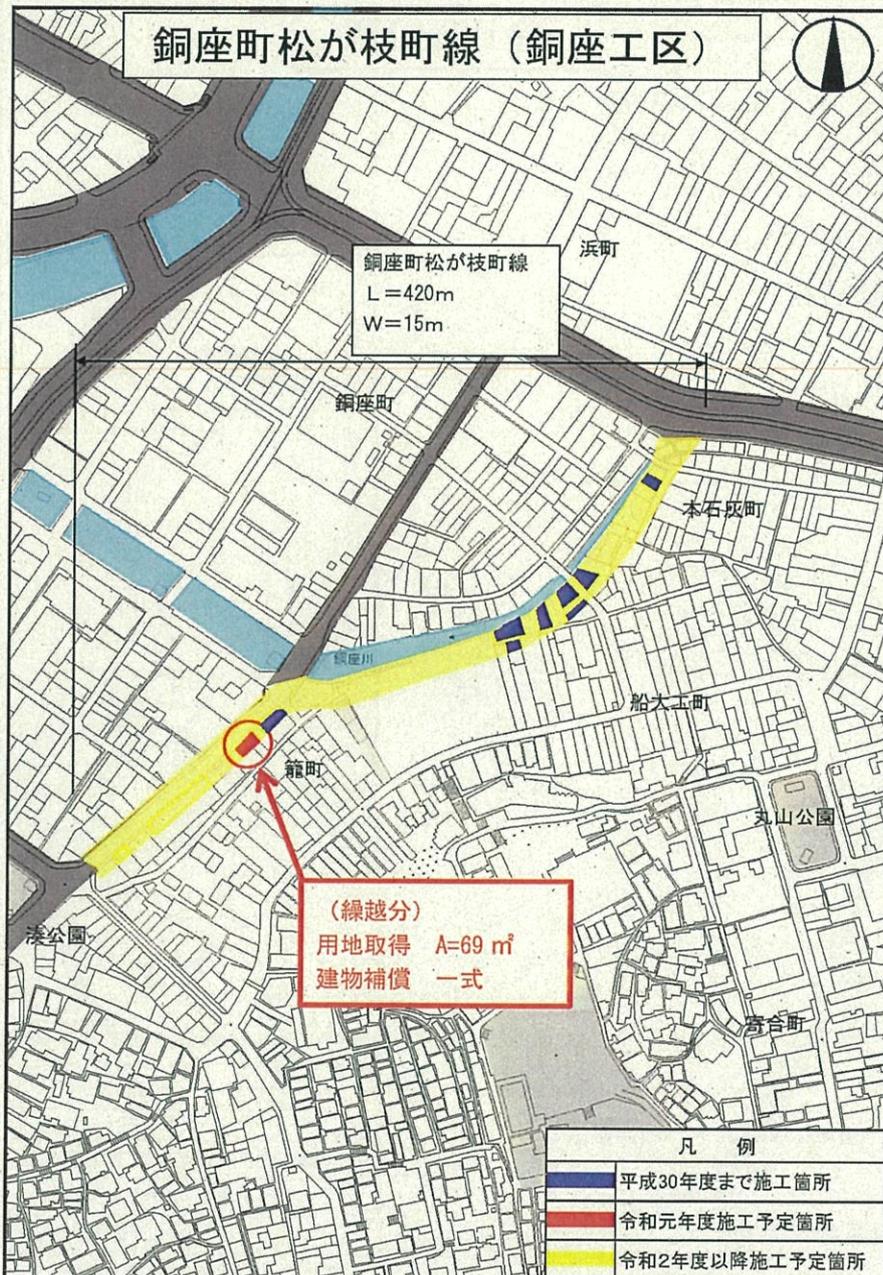


8款 土木費 5項 都市計画費 6目 公園費

※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】公園等施設整備事業費 金比羅公園	予算現額	70,000	31,350	0	34,400	0	4,250
【事業期間】 H22～R3年度 【事業計画】 面積 A=21ha 【総事業費】 612,000千円 【進捗率】 6%(H31年3月末)	支出予定額	31,700	13,350	0	16,500	0	1,850
	繰越明許額	38,300	18,000	0	17,900	0	2,400
繰越事由	施工箇所隣接者の敷地との調整や関係機関との調整に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和2年6月						

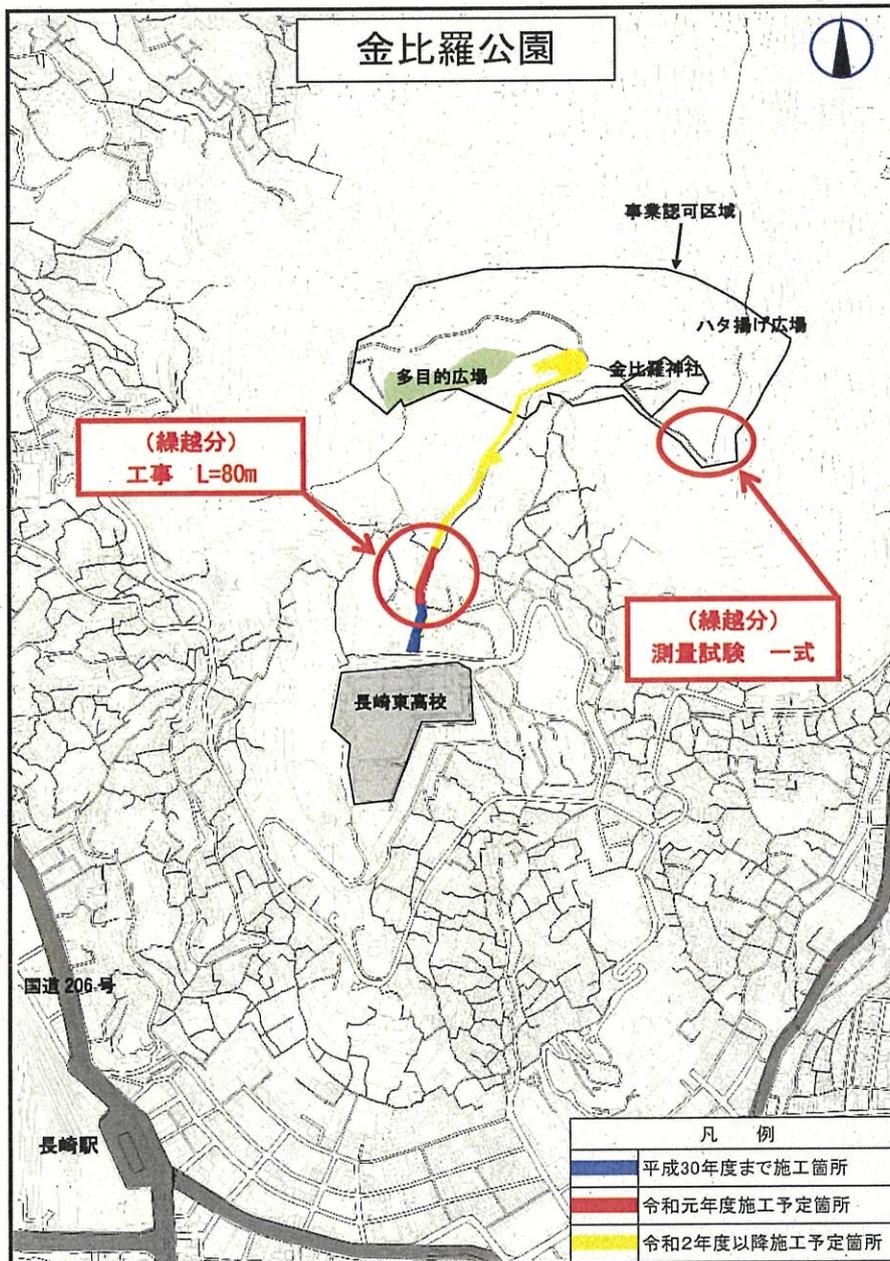

債務負担行為		期間	限度額 (設定額)
第4表 ページ	事項		
10	築町二輪車等駐車場指定管理	令和2年度から 令和6年度まで	千円 4,665

1 債務負担行為の目的

長崎市築町二輪車等駐車場の管理において、長崎つきまち(株)を指定管理者として指定するにあたり、指定期間である令和2年度から令和6年度までの指定管理に係る経費について、債務負担行為の設定を行うもの。なお、令和2年度より利用料金制度を導入する予定である。

2 債務負担行為限度額の内訳

(1) 限度額の年度内訳 【単位：千円】

令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計
933	933	933	933	933	4,665

(2) 限度額の内訳（年間運営経費－利用料金収入） 【単位：千円】

	R2	R3	R4	R5	R6	合計
年間運営経費	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	32,030
人件費	3,735	3,735	3,735	3,735	3,735	18,675
管理費 ※	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	11,050
修繕料	461	461	461	461	461	2,305
利用料金収入	5,473	5,473	5,473	5,473	5,473	27,365
指定管理委託料	933	933	933	933	933	4,665

※管理費：光熱水費、消耗品費、機器保守委託料、その他（保険料）


(3) 財源内訳 【単位：千円】

事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他 ※	一般財源
4,665	—	—	—	4,665	—

※使用料

3 概要

(1) 位置図

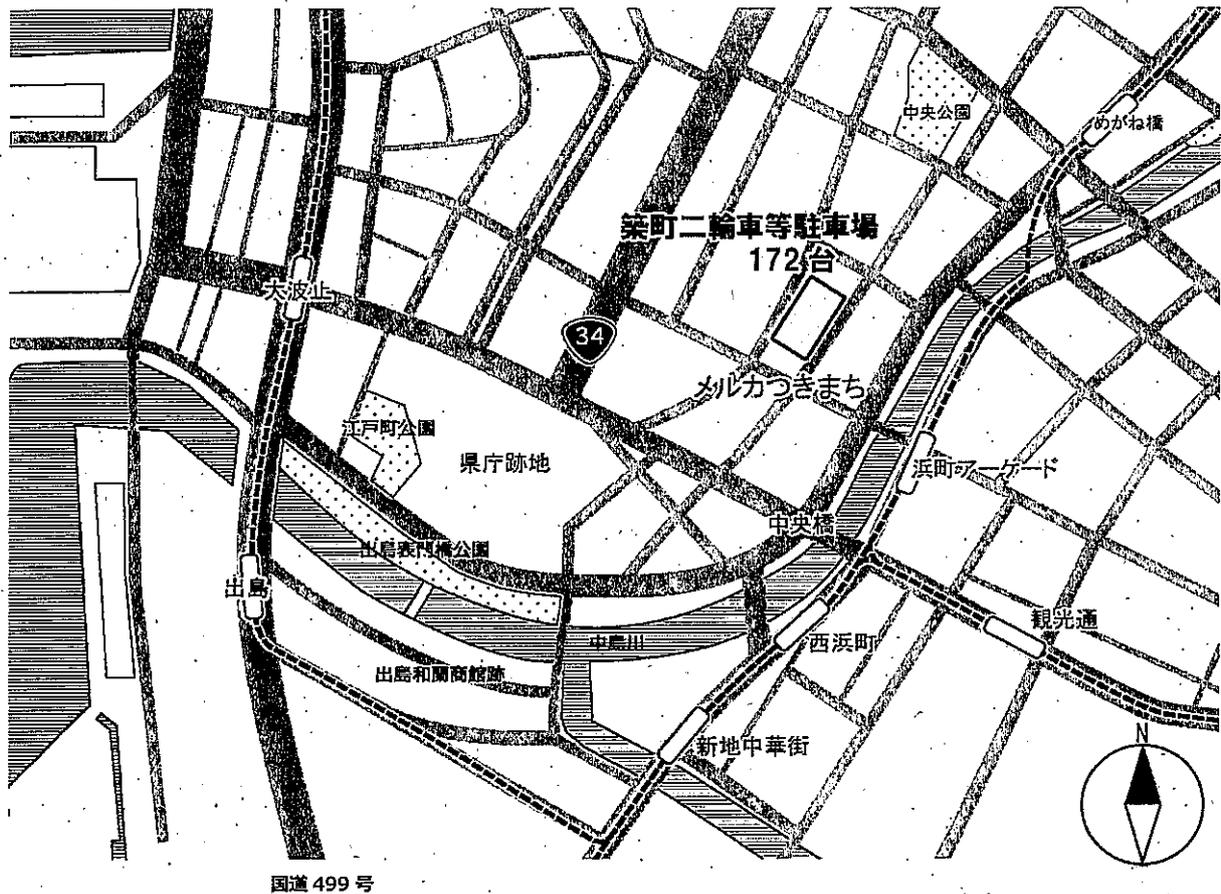

(2) 施設の状況

ア 利用者の推移

【単位：台】

年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
利用台数	36,086	34,910	35,400	31,736

イ 指定管理委託料

【単位：千円】

年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
金額	5,775	5,805	5,996	5,813

ウ 駐車料金収入

【単位：千円】

年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
金額	6,426	6,431	6,301	5,473

債務負担行為		期間	限度額 (設定額)
第4表 ページ	事項		
10	都市計画街路整備事業 (銅座町松が枝町線)	令和2年度	千円 144,000

1 概要

(1) 事業目的

国庫補助である社会資本整備総合交付金を活用し、湊公園から春雨通りにかけての交通混雑の緩和や防災性の向上に加え、地区の賑わいの再生を目的に、銅座川の沿道を歩いて楽しめるプロムナードとして整備を行うもの。

(2) 債務負担行為の理由

都市計画道路銅座町松が枝町線において、令和2年度に契約を予定していた建物の補償交渉が進み、今年度中に契約できる見込みとなったことから補償契約を行いたい、建物解体の完了が令和2年度になることから、債務負担行為を設定するもの。

2 事業内容

【全体計画】

事業期間 : 平成26年度～令和6年度

事業計画 : 延長420m、幅員15m

総事業費 : 4,621,000千円

【事業内容】

	債務負担行為に係る事業内容		
	事業内訳	事業費	備考
令和元年度	用地取得	336,000千円	前払金：7割
令和2年度	建物補償	144,000千円	完成払金：3割（債務負担行為）
合計	—	480,000千円	—

3 財源内訳

事業費	財源内訳				
	国庫支出金 ※1	県支出金	地方債 ※2	その他	一般財源
千円 144,000	千円 72,000	千円 —	千円 64,800	千円 —	千円 7,200

※1 国庫補助率 対象事業費（144,000千円）の50%

※2 起債充当率 地方負担分（72,000千円）の90%（公共事業等債）（交付税措置率22.2%）

銅座町松が枝町線 (銅座工区)



銅座町松が枝町線
L = 420m
W = 15m

浜町

銅座町

本石灰町

銅座川

船大玉町

籠町

丸山公園

湊公園

債務負担行為設定箇所

用地取得 A=78 m²

建物補償 一式

寄合町
