

第192号議案 令和7年度長崎市一般会計補正予算(第4号)

目 次

ページ

《8款 土木費 5項 都市計画費 6目 公園費》

〔繰越明許費補正〕

【単独】公園施設整備事業費 公園施設長寿命化(総合事務所) 2～6

北総合事務所

令和7年11月

予 算 説 明 書【繰越明許費】				事 業 名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
28～29	8 土木費	5 都市計画費	6 公園費	【単独】公園施設整備事業費 公園施設長寿命化(総合事務所)	千円 23, 900

1 事業概要

公園において、長寿命化計画に基づく老朽化した施設の改築・更新を行い、公園利用者が安全・快適に過ごせる公園環境を整えるもの。

2 繰越事由

※北総合事務所

琴海南部運動公園の受変電設備更新において、年度内に変圧器を受注・納入できる事業者がおらず、受変電設備改修工事が年度内に完了しない見込みであるため。

(完了予定時期 令和9年1月)

3 財源内訳

金 額		財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
予算現額	千円 187, 800	千円 —	千円 —	千円 167, 400	千円 —	千円 20, 400
支出予定額	163, 900	—	—	149, 500	—	14, 400
繰越明許額	23, 900	—	—	※ 17, 900	—	6, 000

※一般単独事業債 充当率75% (交付税措置率—%)

4 施行箇所一覧

区分	公園名	所在地	事業内容	事業費(千円)
中央総合事務所	立山公園	立山5丁目	樹木更新	54,000
	神の島公園	神ノ島町1丁目	樹木更新	
	丸尾公園	丸尾町	給水管更新	
	よけば公園	西山3丁目	用地	
	小江原公園	小江原1丁目	ベンチ更新、フェンス更新	
	千歳町緑地	千歳町	ベンチ更新、フェンス更新	
	白鳥公園	白鳥町	フェンス更新	
	瓊の浦公園	恵美須町	フェンス更新	
	ひまわり公園	城山台1丁目	フェンス更新	
東総合事務所	上田之浦公園	田中町	遊具補修	8,400
	東望台公園	田中町	遊具撤去	
	尾崎公園	戸石町	ベンチ更新	
	鶴の尾団地東公園	鶴の尾町	ベンチ更新	
	矢上団地第4公園	かき道4丁目	ベンチ更新	
南総合事務所	平山台緑地	平山台1丁目	公園灯補修	8,900
	鶴見台第2公園	鶴見台2丁目	遊具撤去	
	江川公園	末石町	遊具撤去	
	末石公園	末石町	遊具撤去	
	樺島灯台公園	野母崎樺島町	ベンチ更新、手摺更新	
北総合事務所	そとめ神浦川河川公園	神浦向町	遊具更新	28,500
	琴海南部運動公園	琴海村松町	受変電設備更新	23,900
	黒崎永田湿地自然公園	永田町	木道更新	21,500
	鳴見台近隣公園	鳴見台2丁目	フェンス更新	19,000
	京泊緑道ほか	畝刈町ほか	フェンス更新、四阿補修ほか	18,600
	外海総合公園	下黒崎町	フェンス新設	5,000
合計				187,800

5 位置図・事業内容・写真



事業内容

老朽化した受変電設備の更新 N=1基

受変電設備の主な機器構成


- ・ 変圧器
- ・ 遮断器
- ・ 進相コンデンサ

写真



6 経緯（繰越明許）

（１）変圧器メーカーの製造スケジュール

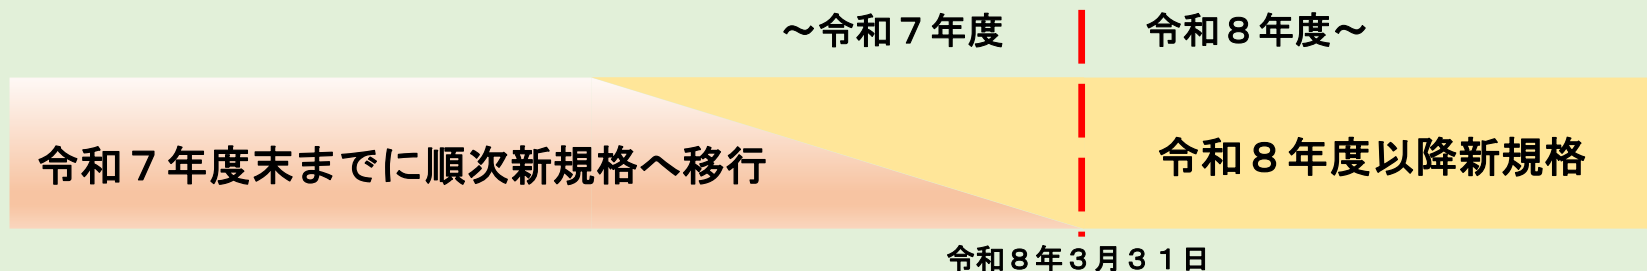

（２）変圧器メーカーへの確認内容

時 期	内 容
令和7年5月	変圧器メーカーに納期を確認した結果、「9月30日までに受注を受ければ納期4か月」との回答。停電時期等を調整のうえ、8月初め起案、9月契約のスケジュールで準備
令和7年7月	改めてメーカーに確認した結果、「納期4か月変更なし」との回答
令和7年8月	起案前に入札参加資格がある業者から「変圧器の納期が確定できない」との情報を入手
	メーカーに確認した結果、「受注が想定以上に集中したため納期の確定ができない」との回答。メーカーに対して納期が確定したら連絡をするよう依頼
令和7年9月	メーカーから「納期10か月必要」との連絡あり

7 スケジュール

